

안전사고사례

안 전 사 고

건축공사부

- 현장 안전사고 전파
〈 불량 사다리 사용으로 인한 낙상 - 무주현장 23.12.01 〉
- 내 용 : 내장 석고작업 시 불량 사다리 사용으로 사고 발생하였고, 낙상 시 사다리에 갈비뼈 충격으로 골절.
- 예방방법 : 작업 전 사용되는 사다리, 말비계 등 안전점검 후 사용



안 전 사 고

건축공사부

- 현장 안전사고 전파
〈 폐목 정리 중 못 밟음 사고 발생 - 청주현장 24.05.09 〉
- 내 용 : 폐목 정리 작업 중 못이 박힌 걸 확인 못하고 밟아서 신발과 발바닥을 뚫고 박히는 사고 발생
- 예방방법 : 작업 중 안전화 착용 필수 및 폐목 발생 시 못 제거 후 정리



안 전 사 고

건축공사부

- 거실 오픈 발판 추락사고 -

- 발생원인 : 거실 오픈 발판 고정 시 합판 고정을 하지 않아 미끄러져 추락발생
- 재발방지 : 1. 발판 설치 시 기준에 맞게 구조재, 합판 고정

사고 현장 사진



사고 발생위치 - 1



사고 발생위치 - 2

안 전 사 고

건축공사부

- 우마 추락사고 -

- 발생원인 : 내장공사 천장 작업 중 우마에서 떨어져 낙상사고 발생
- 재발방지 : 1. 작업발판 준비 철저히 할 것.
2. 기준에 맞는 우마 사용 할 서.

사고 현장 사진



사고 상황 재현 사진



사고 상황 재현 사진

안 전 사 고

건축공사부

- 교통사고 -
- 발생원인 : 자전거와 추돌
- 재발방지 : 방어운전

사고 현장 사진



사고 직후 사진

사고직후 사진

안 전 사 고

건축공사부

- 낙하물 사고 -

- 발생원인 : 유로폴 해체 중 유로폴 머리에 떨어져 충격발생하며 턱끈이 제대로 조여져 있지않아 두부열상 발생
- 재발방지 : 낙하물 주위하며 작업 진행하고, 턱끈 조여서 안전모 착용

사고 현장 사진



안 전 사 고

건축공사부

- 뭇박힘 사고 -

- 발생원인 : 벽체 제작중 미끄러지면서 네일건 오,격발되어 허벅지에 뭇박힘
- 재발방지 : 작업 시 주의하여 작업진행

사고 현장 사진



사고 발생위치(2층 벽체 작업중)



사고 부위 확인

안 전 사 고

건축공사부

- 테이블쏘 열상 사고 -

- 발생원인 : 내장공사 중 원형틀날에 손바닥 찢어짐 사고 발생
- 재발방지 : 작업 시 주의하여 작업진행, 안전커버 설치 필요

사고 현장 사진



안 전 사 고

건축공사부

- 컷소 열상 사고 -
 - 발생원인 : 배관 컷팅 중 컷소에 손가락 열상 발생
 - 재발방지 : 전동공구 사용 시 주의해서 작업진행

사고 현장 사진



사고 직후 사진

사고직후 사진

2024년 안전개선

안전 개선

건축공사부

현장진행간 안전교육 & 공정별 체크리스트

현 장 명	공 종
-------	-----

교육내용 : 현장 안전수칙 & 현장 위험요소 및 주의사항, 작업 진행간 본사 요청사항 확인.

1. 본사 안전수칙 준수. **(일과시작 전, T.B.M 실시 & 신규 현장투입인원 안전교육진행 및 확인서 서명)**
2. 현장소장 및 안전관리직원의 안전작업 지시에 적극 수용.
3. 안전보호구 착용 및 관리철저. **(안전모 턱끈 조임, 안전화착용 및 본사유니폼착용, 등.)**
4. 지정된 흡연장소외 흡연금지. **(소화기 비치된 지정흡연장소.)**
5. 일과시간 중, 음주 금지.
6. 현장 내 출입 또는 이동시 지정된 통로를 이용. **(외부 이동시 반드시 비계계단 이용.)**
7. 중량물 운반 및 이동시 바른 자세로 작업을 하며 허리부상&추락사고 주의.
작업구간의 안전위험요소(고소작업, 바닥상태 등) 확인시, 즉시 보강요청 및 책임자 확인 후, 작업 재개.
8. 일과종료 전, 명일 안전한 작업을 위해, 주변 정리정돈. **(일과종료 20분 전, 현장정리 & 청소 진행)**
9. 일과 종료 후, 당일 작업진행 사진 **(전, 중, 후 5장 이상&현장전경 4장 이상)**을 현장소장에게 제출.
10. 공정완료일, 남은 자재 정리 및 현장정리. **(정리상태 미흡 시, 별도 청소진행처리 발생가능.)**
11. 기계공구 사용시 기계 안전규칙에 따라 보호덮개 시공 후, 작업진행.
12. 상기와 같이 안전수칙 및 본사 요청사항에 대해 적극적으로 이행할것이며, 위의 내용을 위반하여, 당사의 집무상 명예 또는 물질상 손해를 끼칠경우에는 어떠한 처벌도 이의없이 감수할 것을 약속하겠습니다. 또한, 해당 손해액을 지체없이 변상하겠으며, 작업간 안전장구를 착용하지 않고, 사고 발생시에는 본인의 과실을 인정하며, 산재처리 이외의 비용 일체를 본인이 부담함을 약속합니다.

※ 금일작업간 안전관련 주의사항 기입(수기작성) (고소작업/ 위험물관리/ 절단공구/보호구착용관리/ 계절별 휴게)

※ 종사자 의견청취 내역



서OO(협력업체A) : 고소작업에서 사용하는 사다리 불안정 → 확인후 조치예정

※ 현장투입 작업자 안전교육 진행완료 확인서

no.	성 명	혈액형	연락처	생 년 월 일	작업자 확인	현장소장 확인

안전 개선

건축공사부

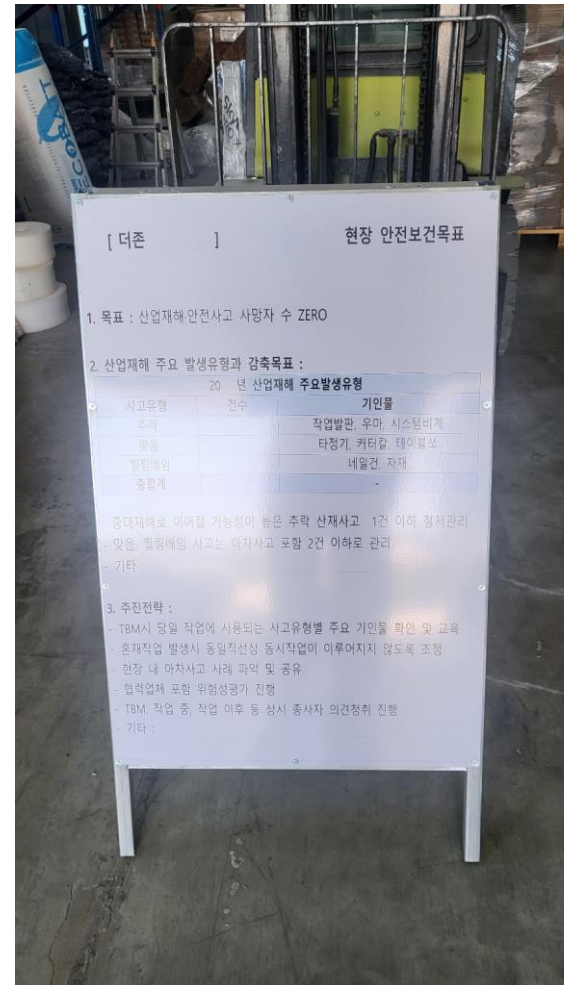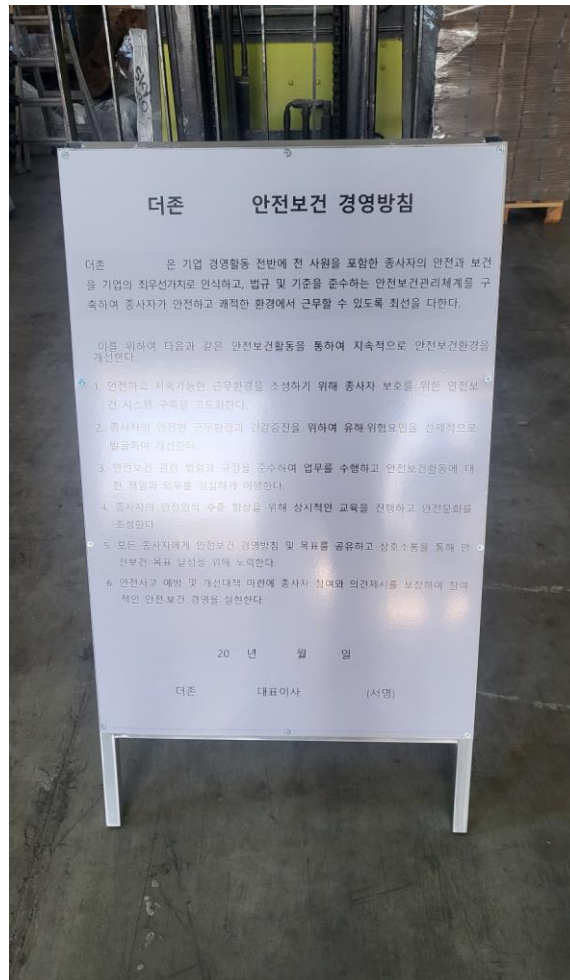

1.수량-현장 당 1EA

2.장소-TBM 실시 장소 / 현관 상시 배치

3.행동-A형 간판 앞 뒷면 중견/하우징 구분 및 TBM일자 수정, 현장명 작성

4.보관 및 교체-공도구 물품으로 파손 시 분사 반납 후 교환 / “현장 상시배치”

안 전 개 선

건축공사부

【별지 제3호서식】

관 리 감 독 자 임 명 장

소 속 :
현 장 :
성 명 :

위 사람을 산업안전보건법 제16조 및 같은 법 시행령 제15조에 의거, 다음 각 호의 안전·보건관리에 관한 업무를 수행할 관리감독자로 임명합니다.

1. 지휘·감독하는 작업과 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무의 확인
2. 소속된 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도
3. 해당 작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치
4. 해당 작업장 정리정돈 및 동로확보에 대한 확인·감독
5. 산업보건의 및 안전관리자·보건관리자·안전보건관리담당자의 지도·조언에 대한 협조(해당시)
6. 유해위험요인의 파악 및 개선조치의 시행에 대한 참여 등 위험성평가에 관한 업무
7. 그 밖에 해당 작업의 안전·보건에 관한 사항
8. 유해하거나 위험한 작업에 근로자를 사용할 때 실시하는 특별교육 중 안전에 관한 교육
(산업안전보건법 시행규칙 별표 4)
9. 그 밖에 해당 작업의 성격상 유해 또는 위험을 방지하기 위한 업무
(산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 2 및 별표 3)

20 년 월 일

더존하우징 대 표 이 사

직인

1.임명 시기: 현장 배정시

2.수행 기간: 현장배정~준공까지

***현장의 관리 감독자의 책임을 다함으로
무사고 현장으로 수행 할 수 있도록 임명**

***관계자미팅 시 수령하여 엔딩까지 보관**

안전 개선

건축공사부

위험성 평가 체크리스트

☐ 최초 / ☐ 정기 / ☐ 수시

담당자	관리감독자 OR 현장소장

공종 :	체크리스트										담당자 : 평가일시:				
대상	유해위험요인	현재안전보건조치	현재위험성			관리대상	위험성 감소대책	개선예정일		개선 후 위험성		결정		개선 완료 확인	
			가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	Y/N				가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	적정	보완	
	안전모를 개인보호구 미착용하고 작업중 부딪히거나 낙하	차재 반입 운반시 안전모 등 개인보호구 착용 철저(TBM교육)	2	2	4				즉시						2022-03-20
	개인보호구 미착용 상태에서 장비에 신체부위 접촉, 협착	작업 중량을 준수하여 운반하고 걸이가 낀 부재 등은 가능한 2	2	1	3				본사 조치 완료						본사, 현장 완료
	차재 반입, 운반시 지게차 등으로부터 충돌, 협착	차량 진입시 유도자 배치하여 근로자통제	2	2	4										
	타점층 또는 타카건 사용시 안전수칙 미준수하여 붕괴, 충돌	타점층 또는 타카건 사용시 신체부위는 향하지 말고 꼭 교육	2	2	4										
	불안전한 말뚝, 사다리 또는 이동식 비계 사용하다가 추락	8/T 사용시 안전사일 설치, 작업대로 사다리 사용 금지, 말뚝	2	2	4										
	소형 절단기, 전기톱 등의 안전장치가 파손되어 신재 협착, 협착	소형 절단기, 전기톱 등의 안전장치가 파손 되어 신재 협착, 협착	3	3	6										
	전동기구 사용하다가 칼날	전기기계 사용시 잡지, 누전 차단기 연결 사용	3	3	6										
※ 발굴된 "유해위험요인"의 위험성이 6월 이상일 경우 "관리대상"에 포함하여야 하며 개선이행사항을 관리하여야 함 ※ 위험성 감소대책의 개선은 가급적 "즉시" 시행하며, 구조적인 문제에 기인하는 경우 본사 차원에서 적극적인 개선대책 이행 지원이 이루어져야 함 ※ 유해위험요인 및 감소대책 이행의 증빙자료로 사진을 첨부하고, 현장 안전보건관리책임자는 해당 사진을 근거로 하여 개선조치 이행여부를 확인해야 함															
비고															
■ 근로자 참여(자필서명)															
공종	회사	근로자 성명					서명	의견							

최초 / 정기 / 수시 로 준비 되어야 하며 , 분기별 본사 작성 후 배포 예정
현장안전을 위한 참고리스트로 모두가 보관 후 공사 전 “필히 참고” 바랍니다.


-(더존)은 현재 중대재해처벌법의 기준으로 6개월 이상의 중상위 발생, 2회의 경우 중대재해벌법 관리 대상이 되므로
24년 하반기 안전은 특히 노력합니다.

안 전 개 선

건축공사부

- 그늘막 시공 -


- 자재 : 본사지급자재 (자재부 요청) / 훼손 시 자재부에 반납 후 재지급요청
- 설치시기 : 골조공사 시 비계 설치 후 바로 시공 (폴대는 현장에 수직 부재 사용하여 설치)
- 설치위치 : 1. 컨테이너가 있는 경우 컨테이너에 연결하여 설치
컨테이너가 없는 경우 비계이용해 연결하여 설치
2. 작업자 휴게 쉼터 문구 부착 (배부예정)
3. 재떨이 비치하여 흡연구역 지정

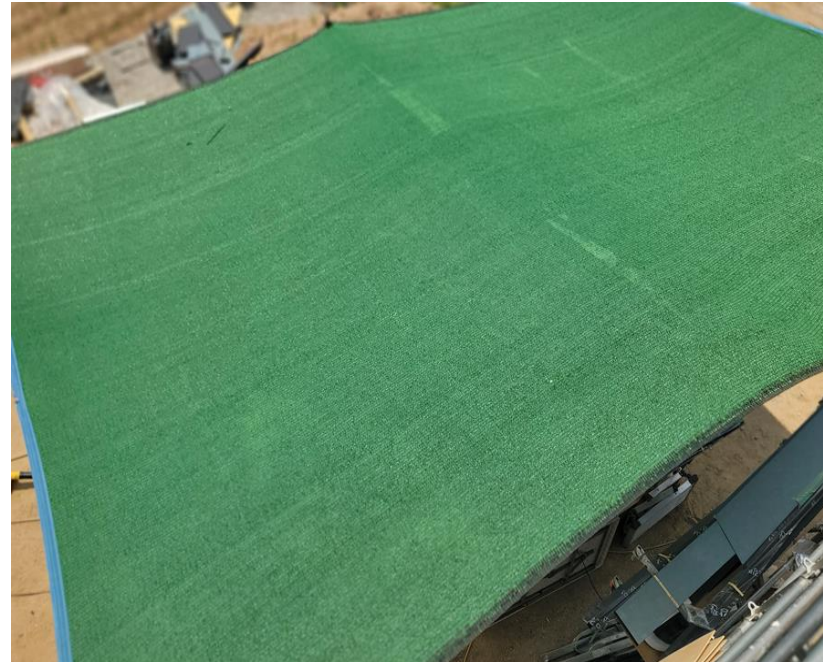

안 전 개 선

건축공사부

- 개구부 추락사고 -
 - 발생원인 : 개구부 고정 미흡으로 인한 추락
 - 재발방지 : 1. R.C현장 개구부 안전난간설치
2. 목조 천창부분 방수шит 시공 후 합판으로 고정
천창시공시 합판 제거 후 천창시공

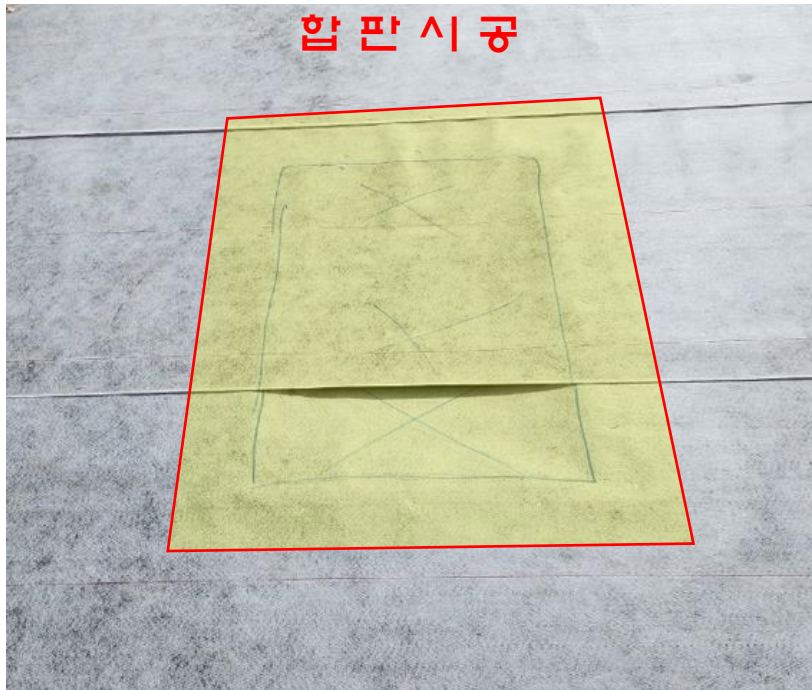

안 전 개 선


건축공사부

- 안전 난간대 현황 및 시공방법
- 목 적 : 1. 작업자 추락에 대한 방지
2. 안전난간 존치 빈틈없게 유지
- 변경전 : 현재는 골조공사 시 목재를 사용하여 안전난간을 시공하고 하고 있었음
- 변경후 : 양카형난간대 및 각종 위치에 맞는 난간대를 사용하여 고정 예정
- 시공시기 및 방법
- 설치위치 : 계단, 2층 외부 데크, 오픈침실과 연결된 부분과 추락 예상되는 부분 등.
- 설치시기
 1. 목골조공사 중 계단 설치 완료 후 즉시 / 2층데크 또는 추락예상되는부분 즉시
 2. 내장공사 중에도 계속 유지
 3. 내장공사 계단판 시공 후 금속(난간)업체 바로 투입하여 실측할때 난간고정부위에 금속(난간)업체에서 시공
 4. 본 난간설치 시 까지 안전난간 유지
 5. 2층 외부 난간은 안전난간 설치 후 비계해체 진행

안전 개선

건축공사부

- 안전 난간대 현황 및 시공방법

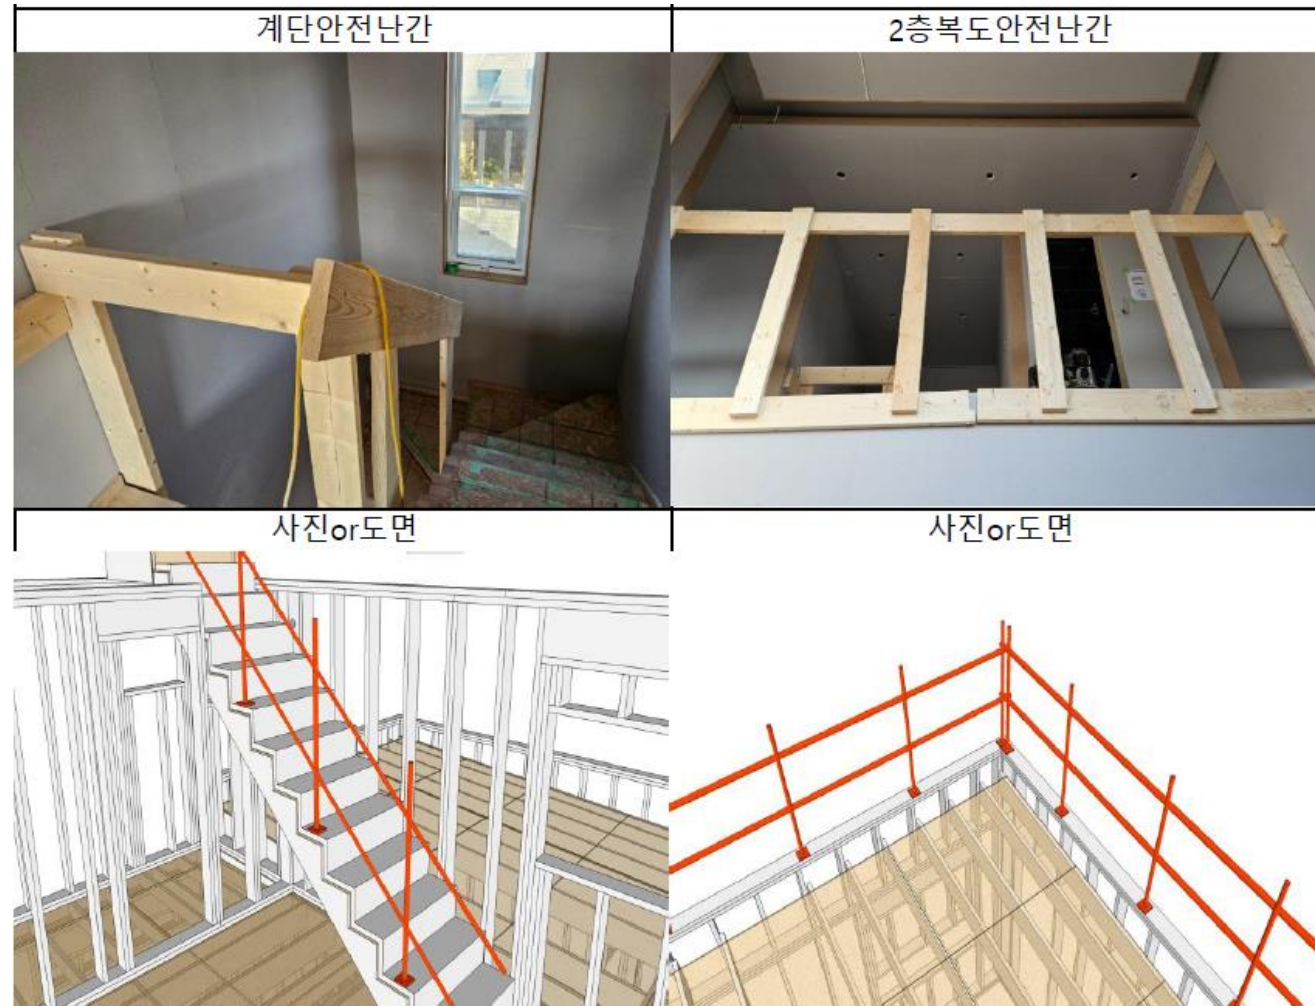

안전 개선

건축공사부

- 양카형 안전난간대



적용위치 : 바닥에 고정이 필요 부위에 설치
양카볼트, 피스 등으로 고정필요

안전 개선

건축공사부

- 안전 난간대 현황 및 시공방법



적용위치 : 계단에 경사면으로 고정

안전 개선

건축공사부

- 안전 난간대 현황 및 시공방법



적용위치 : 슬라브 단부에 고정

안전 개선

건축공사부

- 안전 난간대 현황 및 시공방법



적용위치 : 발코니(두겹)부분 고정

안 전 개 선

건축공사부

- 안전벨트 및 고리 착용의무 (고소작업자)


- 고소작업자에 대한 안전관리 메뉴얼

1. 안전모 착용
2. 추락방지 안전벨트 착용
안전고리 채결 후 작업진행

- 고소작업해당 공중 업체 본사와서 관련 내용 교육진행 (지붕, 외장, 골조)

- 최초 안전벨트 및 안전고리는 회사에서 지급 현장별로 안전장구 지급대장 작성하여 현장 보관

- 현장에 작업 투입 시 추락방지 벨트와 고리 장착 후 작업진행되고 해당기준 미달 시 현장투입불가 및 작업 중에도 해당기준을 지키지 못 할 시 현장에서 퇴출 해당기준 3회 어길 시 협력업체 추가 현잔 진행 여부 결정

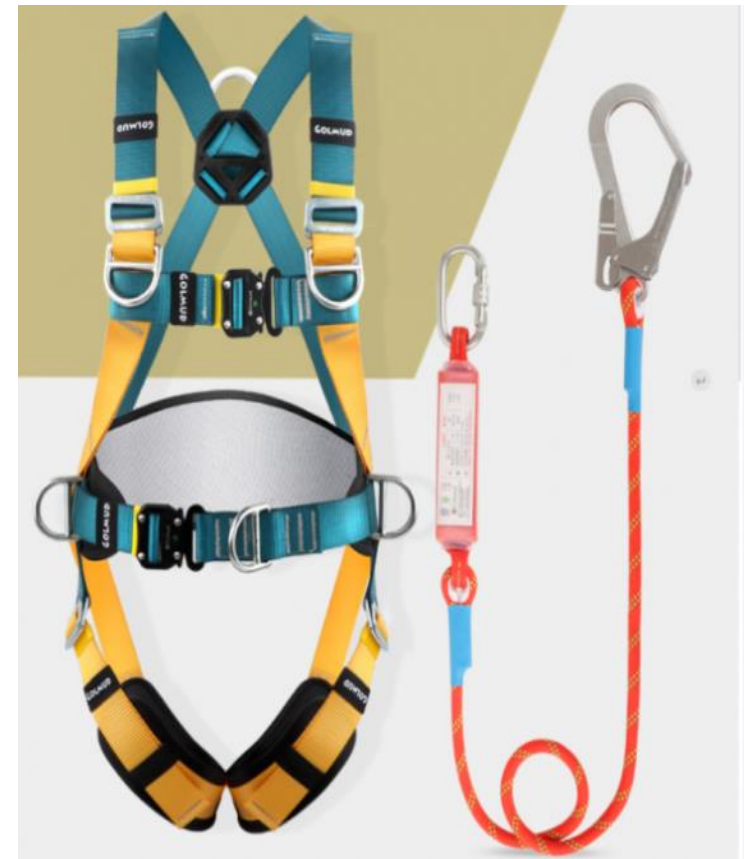

안 전 개 선

건축공사부


- 계단 발판 시공 방법
- 목 적 : 1. 도배공사 시 추락에 대비한 발판작업
- 변경전 : 현재는 도배시공시 사다리안 목재로 위험한 형태로 시공 중
- 변경후 : 도배공사전 발판작업을하여 도배공사 시 위험요소 제거
- 시공시기 및 방법
- 설치위치 : 계단
- 설치시기
- 1. 도배공사 전 발판시공
- 2. 현재 내부 도어를 마루 시공 후 시공하고 있으나, 이를 도배공사 전으로 당겨 내부도어시공과 계단 발판을 시공 진행
- 3. 도배완료 후 해체는 현장소장과 직영을 통해서 해체 작업진행

- 오픈천장 및 계단 안전발판, 난간 설치 기준 -

1. 최우선으로 이동식 비계사용하여 안전발판 확보
차선으로 구조재로 견고하게 발판 설치

1.1 구조재발판 설치 기준

2x10 벽체스터드에 고정 후 2x10 상단에 2x6 @400간격으로 고정
수직 부재 고정 부분은 2x4를 2x6에 덧댐고정 후 수직 부재 고정
2x6상단에 OSB 합판 못으로 고정하여 합판 움직임 없도록 고정
벽체와 발판사이 이격거리는 100MM미만으로 이격 (4면모두 동일)

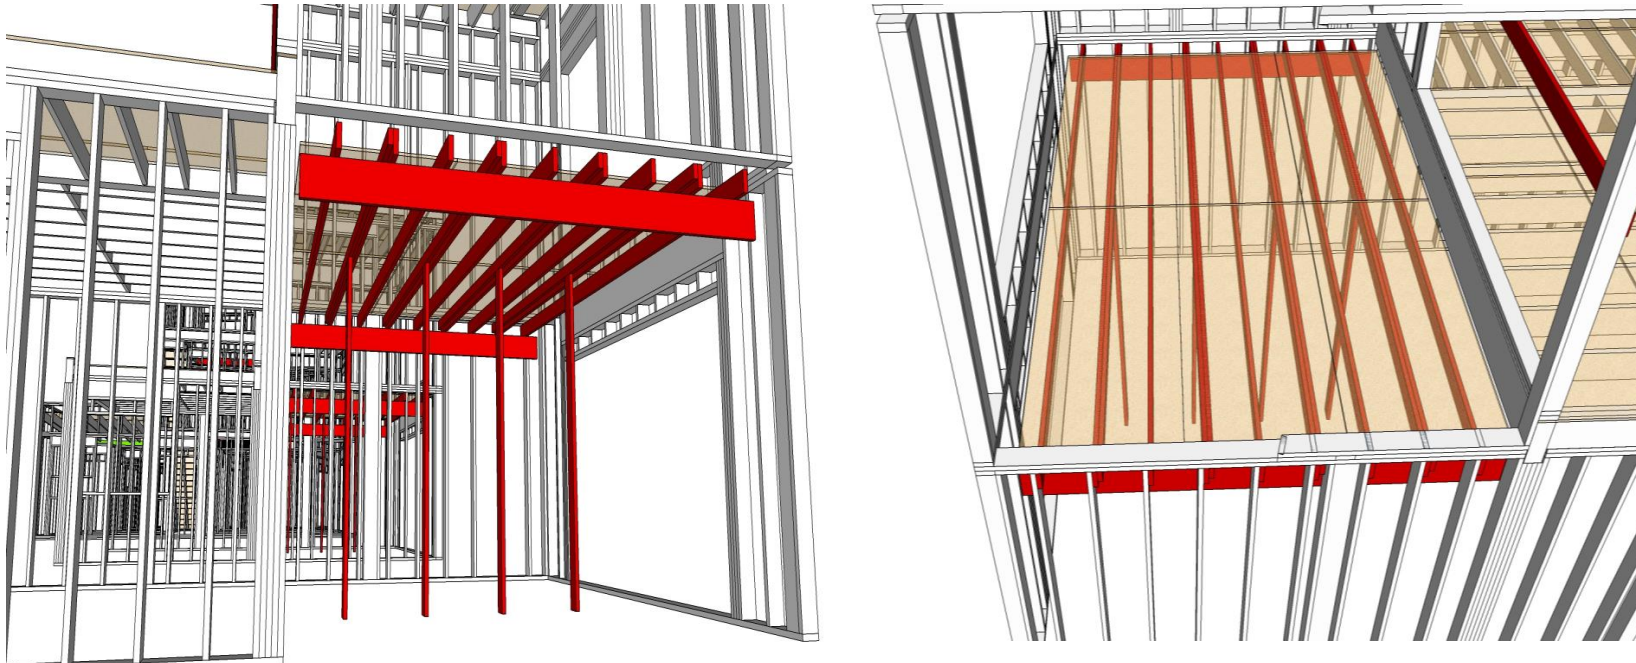

안전 개선

건축공사부

- 현재 시공 중인 안전 난간 현황



계단 안전 난간



계단 안전 난간



파이트 대각선 고정 방법



파이트 대각선 고정 방법

안전 개선

건축공사부

- 현재 시공 중인 안전 난간 현황



계단 안전 난간



계단 안전 난간



거실 오픈 복도 안전 난간



거실 오픈 복도 안전 난간

2025년 안전개선

안전기준메뉴얼

건축공사부

- 현장 비치 안전 용품 (상시 보유)-

1. 안전모 : 10개
 2. 안전화 : 3개 (260mm, 270mm, 280mm)
 3. 안전벨트 : 5개
 4. 보호경 : 5개
- 현장 개설 시 지급 (관계자미팅시)
 - 지급시 지급확인서 작성하여 자재부에 지급 업체, 내용 전달

금일 1층 창고에서 개인별 안전용품 지급 예정
공사부 지시에 따라 각자 수령하여 관리
지급확인서 및 사진자료 없이 지급시 페널티

안전기준메뉴얼

건축공사부

- 더 존 현 장 안 전 수 칙 -

- 안전이 확보된 상황에서 작업진행

비계, 발판, 안전난간 미설치등의 불안요소 확인 시 작업 즉각 중단.

- 현장 소화기 비치

- 흡연은 지정된 구역에서 흡연

> 안전 미확보상태에서 무리한 작업 진행 시 해당업체 또는 담당소장 강력 페널티적용

- 1차 : 즉시공사중단 -안전확보 후 재공사

- 2차 : 즉시공사중단 및 차기현장 유보(협력업체등록불가)

- 담당소장 : 페널티적용 (경위서 및 시말서작성, 인사고과 적극반영)

안전기준메뉴얼

건축공사부

- 오픈천장 안전발판 설치 기준 -

구조재발판 설치 기준

2x10 벽체스터드에 고정 후 2x10 상단에 2x6 @400간격으로 고정
수직 부재 고정 부분은 2x4를 2x6에 덧댐고정 후 수직 부재 고정
2x6상단에 OSB 합판 피스로 고정하여 합판 움직임 없도록 고정
벽체와 발판사이 이격거리는 100MM미만으로 이격 (4면모두 동일)
발판 설치 높이는 2층 탑플레이트 상단으로 시공

골조팀 작업순서

- 1층 벽체 시공 시 바로 즉시 발판 설치 진행
- 계단 즉시 설치 지시 (2층 공사 전 설치)



발판, 계단 미설치 시 후속 작업 진행 불가
미설치 적발 시 현장소장, 업체 강력한 패널티 부과

단, 발판 시공이 어려운 도면의 경우 골조공사 전 감리담당자와 협의

※공무팀 발판설치비용 산정 업체지급(자재지급)

안전기준메뉴얼

건축공사부

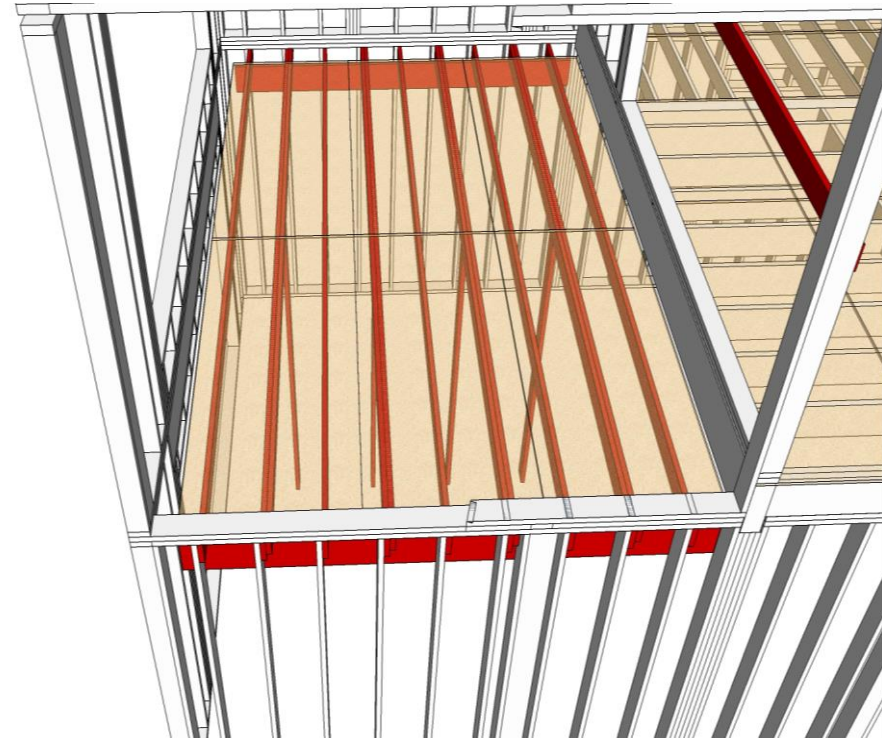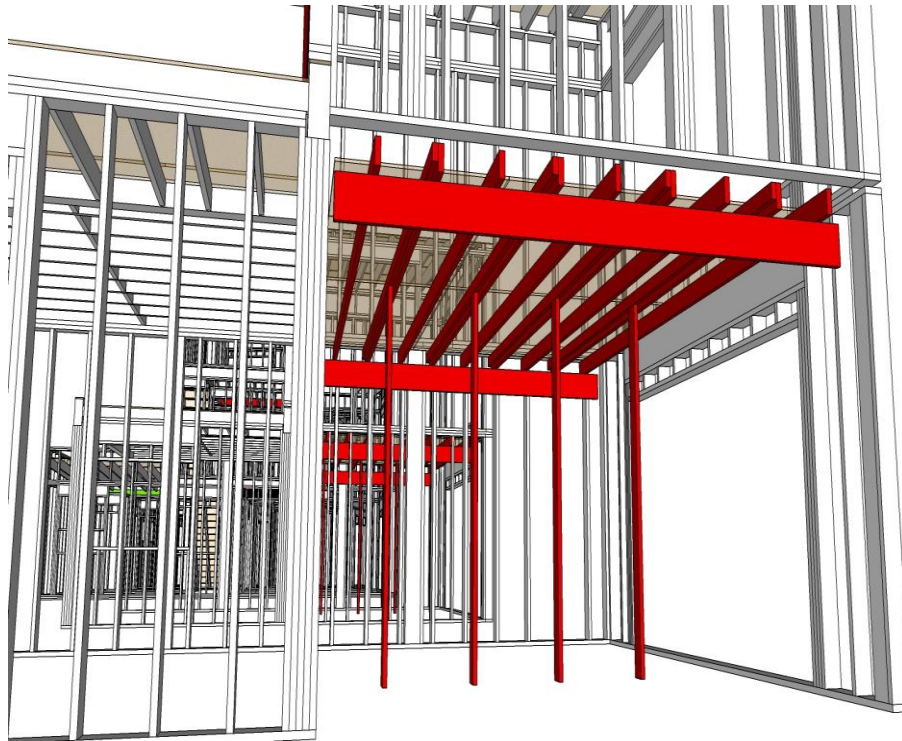

안전기준메뉴얼

건축공사부



안전기준메뉴얼

건축공사부

- 계단 안전발판 설치 기준 -

구조재발판 설치 기준

벽체에서 200mm이상 이격하여 설치 (추후 마감 시공 공간 확보)

2x6이상 목재 간격 @400 사용하여 장선 설치

수직 받침대 설치 후 가새 고정하여 흔들림 방지

바닥 합판고정 피스 고정

내장팀 작업순서

- 계단을 천장, 벽체를 우선으로 작업 진행 한 후 발판 해체 해 이후 작업 용이하게 진행
- 단열재 사전 시공 시 계단부위는 제외하고 내장팀 투입 시 단열재 시공
- 해체한 발판은 현장에 그대로 보관하여 이 후 공종에서 사용 할 수 있도록 현장소장에게 인계


발판 미설치 시 후속 이후 작업 진행 불가

미설치 적발 시 현장소장, 업체 강력한 패널티 부과

단, 발판 시공이 어려운 도면의 경우 골조공사 전 감리담당자와 협의

안전기준메뉴얼

건축공사부

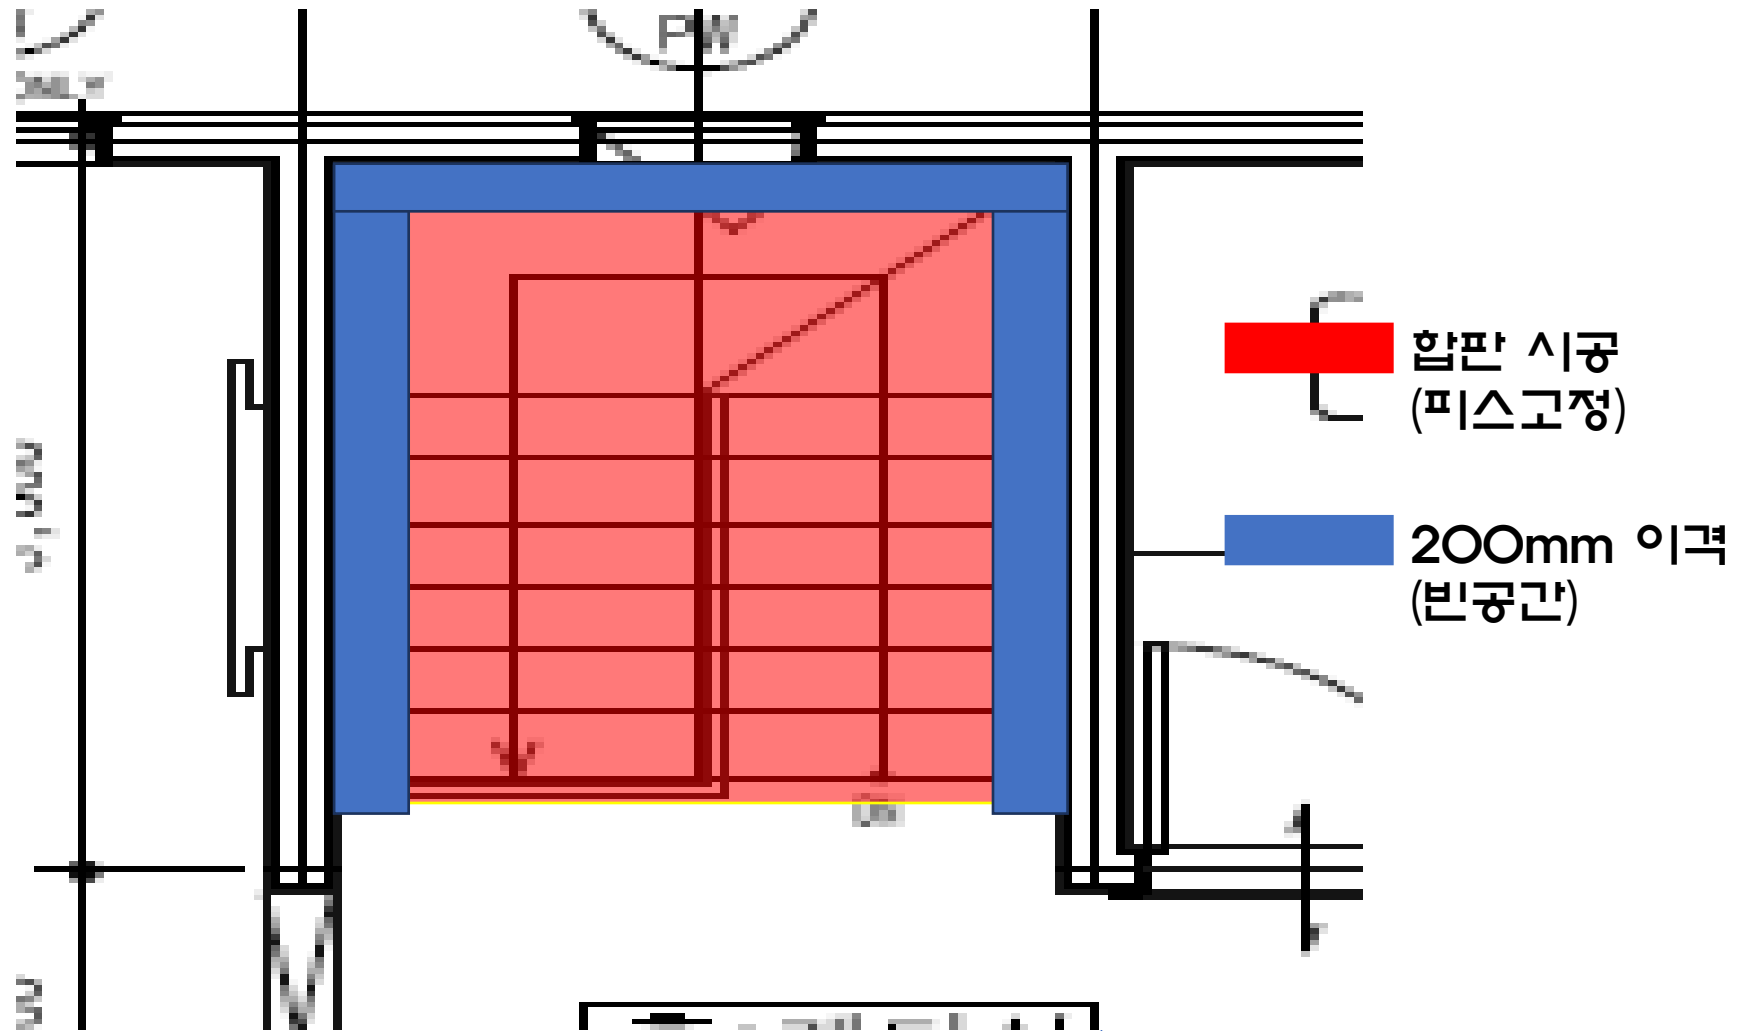

안전기준메뉴얼

건축공사부



안전기준메뉴얼

건축공사부



합판만 해체해서도 관리 가능

2. 안전교육

건축공사부

- 안전난간 및 비계설치/해체기준 -

- 안전난간 설치 기준

1. 목골조 공사 중 추락 위험이 있는 개구부 생성 시 바로 설치
예) 지붕합판 우선으로 시공하기위해 계단 나중에 시공시 개구부 안전난간설치 (2층 복도 동일)
2. 안전난간 설치 이후 작업진행으로 해체 한 경우 작업 완료 후 바로 재설치
3. 2층 외부 난간설치 부분은 비계해체 전 본난간 설치 후 해체
타이밍상 내부 난간이 늦게 설치되는 경우 난간설치 2회 인정

- 비계설치 기준

1. 1층 벽체시공 후 비계설치 중 2회 인정 (2층 기준)
2. 2층 난간공사 완료 후 비계 해체

1. 방통타설 전 기둥제거가능하도록 설치

발판 해체 - 내장팀 (내장공사 완료시점에 철거)
자재 재사용가능하도록 관리필요

2. 외부 비계설치시 지붕 최상단 높이까지 설치하고, 와이어&로프 (10mm이상) 격자 5m 간격으로 설치하여, 안전대 사용할 수 있도록 전도 및 추락방지 대비

교 육 내 용

건축공사부

- 비계 높이-



1층 벽체 작업 중 로프 설치



1층 벽체 작업 중 로프 설치

교 육 내 용

건축공사부

- 비계 높이 및 로프설치 -

- 목 적 : 고소 작업 시 안전 확보
- 방 법 : 가장 높은 지붕 면 보다 1200mm 높게 시공
비계 설치 후 로프 설치해 안전고리 착용 후 작업 진행



비계 높이 시공



비계 로프 설치

1. 전파사항

건축공사부

- 비계 설치시기 -



교육 내용

건축공사부

- 동절기 안전수칙 -



한랭질환 예방 수칙



따뜻한 옷



따뜻한 물



따뜻한 장소

긴급 시 119 신고 (후송)



장시간 한파에 노출되면 저체온증, 동상 등 심각한 건강피해가 나타날 수 있습니다.

건설업 안전보건활동



위험성평가

- ▶ 위험요인 파악 및 개선
- ▶ 작업자 참여



T.B.M.


- ▶ 작업 전 안전점검 회의
- ▶ 위험성평가 결과 공유



작업중지

- ▶ 급박한 위험이 있는 경우
- ▶ 작업중지 및 대피


- 안전벨트 및 고리 착용의무 (고소작업자)
 - 고소작업자에 대한 안전관리 메뉴얼
 1. 안전모 착용
 2. 추락방지 안전벨트 착용
안전고리 채결 후 작업진행
 - 고소작업해당 공중 업체 본사와서 관련 내용 교육진행 (지붕, 외장, 골조)
 - 최초 안전벨트 및 안전고리는 회사에서 지급 현장별로 안전장구 지급대장 작성하여 현장 보관
 - 현장에 작업 투입 시 추락방지 벨트와 고리 장착 후 작업진행되고 해당기준 미달 시 현장투입불가 및 작업 중에도 해당기준을 지키지 못 할 시 현장에서 퇴출 해당기준 3회 어길 시 협력업체 추가 현잔 진행 여부 결정

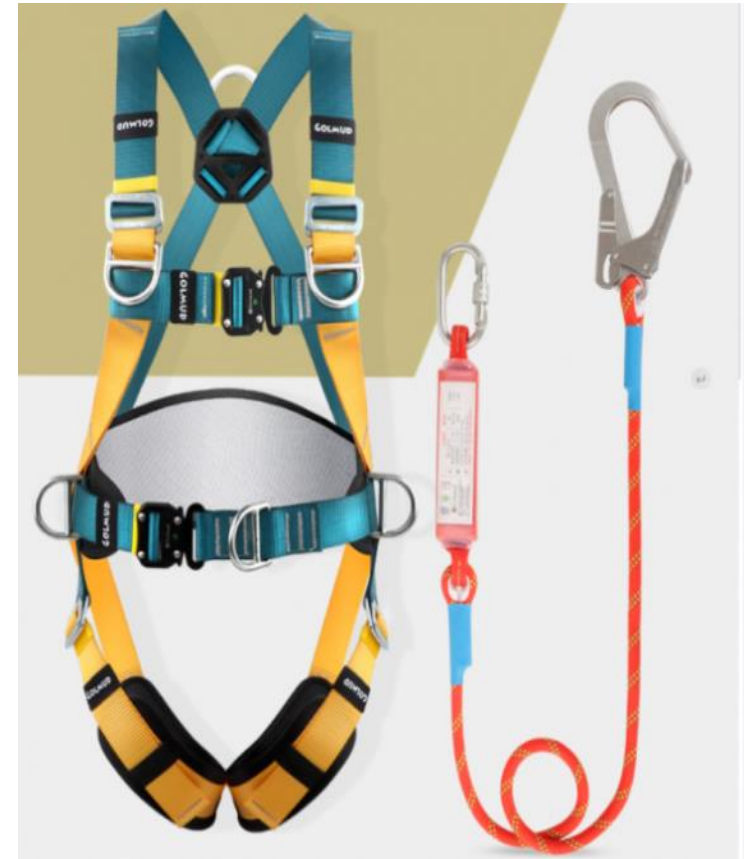

1. 전파사항

건축공사부

- 개구부 추락사고 -
 - 발생원인 : 개구부 고정 미흡으로 인한 추락
 - 재발방지 : 1. R.C현장 개구부 안전난간설치
2. 목조 천창부분 방수슈트 시공 후 합판으로 고정
천창시공시 합판 제거 후 천창시공

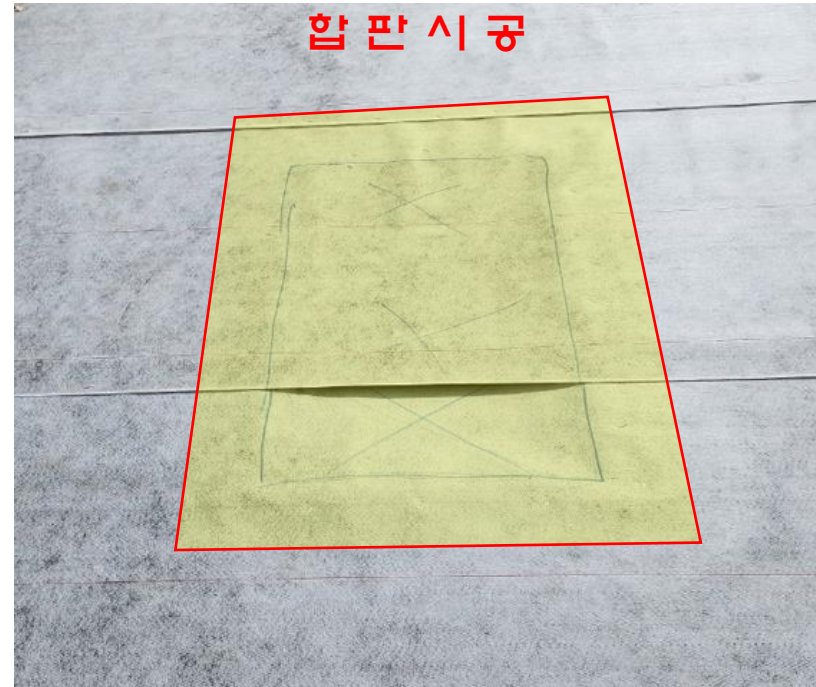

3. 안전교육

건축공사부

- 말비계, 우마, 사다리 사용기준 -

-폭 400mm 이상, 길이 2m 이하, 높이 1200mm 이하, 다리발 각도 75도 이하



3. 안전교육

건축공사부

말비계

- ✓ 안전모 및 내열성 보호구 착용
- ✓ 화재 감시자 인근 배치
- ✓ 작업자 5m 이내 소화기 비치
- ✓ 작업장 주변 가연성 물질 제거



아웃트리거
설치

최대 높이
준수

미끄럼 방지
부착

발끝 막이판
설치

3. 안전교육

건축공사부

이동식틀비계

- ✓ 전도방지용 아웃트리거 설치
- ✓ 작업발판 위에는 안전난간 설치
- ✓ 작업자의 안전대 및 안전고리 체결
- ✓ 작업대 위에서 3인 이상 작업금지
- ✓ 작업자가 탄채로 작업대 이동금지



아웃트리거
설치



안전난간
설치



안전고리
체결



3인 이상
탑승금지

3. 안전교육

건축공사부

사다리 안전

이것만은 꼭 지키세요!



안전모
쓰고!



안전대
걸고!



반드시
잡고!



고용노동부

산업재해예방

안전보건공단



이동식 사다리 안전 점검표



3. 안전교육

건축공사부

- 테이블쏘 안전커버 -

- 테이블쏘 안전커버 설치 -



건축공사부

1. TBM의 주체는 작업자 즉 작업 팀장이 진행 하는게 원칙.
2. TBM진행시 금일 작업간의 위험요인을 서로 이야기하며 작업자 전원에게 교육
(아주 중요한 작업으로 현장소장이 필히 작성)

*** 개인정보 및 고유식별정보 수집·이용 안내**

<다목적사업>은 결의사항 확인을 위한 행정정보 공개이율을 위해 「행정정보 공개이율 지침」 제36조, 「개인정보 보호법」 제15조제1항에 근거하여 아래와 같이 개인정보 및 고유식별정보를 수집·이용하고자 합니다.

◆ 개인정보 수집·이용 내역

개인정보 항목	수집·이용 목적	수집·이용 기간
결의사항 확인을 위한 행정정보 공개이율	이름, 본적(등록지주소)주소 (신원조사, 신원확인, 신원조사)	초안기

* 동의 거부권한 안내 본 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 수 있으나, 유효하게될 경우 업무가 지체되어 처리시간이 지연될 수 있습니다.

◆ 고유식별정보 수집·이용 내역

고유식별정보 수집·이용 목적	고유식별정보 항목	보유·이용 기간
결의사항 확인을 위한 행정정보 공개이율	주민등록번호 등 (신원조사, 신원확인, 신원조사)	초안기

* 동의 거부권한 안내 주민등록번호는 「주민등록관리법 시행규칙」 제27조, 제28조, 제33조 등 제41조에 따라 수집·이용합니다. 그 외 고유식별정보의 수집·이용에 대한 동의를 거부할 수 있으나, 유효하게될 경우업무가 지체되어 처리시간이 지연될 수 있습니다.
(사내처리용, 기록관리용, 기타 업무상 필요 시 수집·이용함)
* 고유식별정보 : 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호 등

◆ (개인정보 수집·이용자 목록)

업 소 명	성 명	직 역	개인정보 수집·이용 동의	고유식별정보 수집·이용 동의
김영하	박세현	차장	☑ 동의 ☐ 미동의	☑ 동의 ☐ 미동의
1 / 김민석	김민석	주무관	☑ 동의 ☐ 미동의	☑ 동의 ☐ 미동의
1 / 조영하	조영하	주무관	☑ 동의 ☐ 미동의	☑ 동의 ☐ 미동의
			☐ 동의 ☐ 미동의	☐ 동의 ☐ 미동의

* 수집한 개인정보는 정보주체의 동의 없이 수집한 목적 외로 사용하지 않습니다. 제3자에게 제공하지 않습니다.

본 인은 위 사항의 처리를 위하여 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공개이율 지침을 통하여 이용기관의 업무처리담당자가 전자적으로 본인의 공개이율 행정정보(참서부서)를 확인하는 것에 동의합니다.

2025. 12. 05.
(성명) 김영하 (직위) 차장

위 동의서의 제출자

더불어민주당 구하

3. 안전교육

건축공사부



더 존 하 우 징

445-893 경기도 화성시 봉담읍 동화북길 63

TEL 1644-3696 FAX 031-278-6073

문서번호 : DJ-250113 - 1

2025. 01. 13.

수 신 : 더존 협력업체

참 조 : 건축공사부

제 목 : 안전모착용

1. 귀사와 귀하의 건승과 발전 및 건강을 기원합니다.

2. 지난해 중처법시행이 되었고, 안전한 현장을 만들기 위해 현장에서 많은 노력이 이루어져 큰 사고없이 지난해를 보낼 수 있었습니다. 다만, 아직도 안전모 착용이 생활화 되지 않고 있는 현장들이 있어 안전모착용을 생활화 하고자 안전기준에 대해 알려드립니다.

3. 안전모 미착용시 패널티 부과 예정이며 1인 50,000원으로 정합니다.

또한, 재발시 가중 패널티부과 하오니 이점 유념하셔서 안전모 착용을 생활화 해주시길 바랍니다.

안전기준 미흡 시 현장에서 퇴출되며 폐사의 모든 공종에는 참여 할 수 없음을 알려드립니다.

위 내용은 전체현장의 안전을 위해서 시행하는 바이니 반드시 지켜주시고, 사고 없는 현장이 될 수 있게 모두의 노력이 필요합니다.

- 안전모관련하여 협력업체
전체 공문 발송

- 현장 안전모 미착용 시
양벌규정적용
직영소장 : 1차-경위서/ 2차-시말서
관리소장 : 패널티
책임소장 : 패널티
협력업체 : 패널티

- 패널티금액 : 1인/50,000원

- 재발시 X2 적용

- 안전사고 발생되지 않도록 현장에서
적극적인 관리 필요!

더 존 하 우 징
대표이사 이 용 진



3. 안전교육

건축공사부



더 존 하 우 징

445-893 경기도 화성시 봉담읍 동화북길 63 ☎ 1644-3696 FAX 031-278-6073

문서번호 : DJ-250120 - 1 2025. 01. 20.

수 신 : 더존 협력업체

참 조 : 건축공사부

제 목 : 안전관련 공문- 추락사고 및 이동식 비계, 말비계, 이동식 사다리의 안전관리 강화 전달

1. 귀사와 귀하의 건승과 발전 및 건강을 기원합니다.

2. 최근 2025년 들어 추락사고가 빈번하게 발생하고 있습니다.

이러한 사고를 예방하기 위해, 이동식 비계와 말비계의 안전 원칙을 다시 한번 강조하고자 합니다.

3. 이동식 비계 및 말비계의 안전 원칙

이동식 비계와 말비계는 안전하게 사용해야 하며, 설치 시 반드시 안전 기준을 준수해야 합니다. 비계의 구조적 안정성을 확보하고, 사용 전 항상 점검을 실시해 주시기 바랍니다. 공사의 안전을 위해 본사의 지원이 필요한 경우 언제든지 요청해 주시기 바랍니다.

4. 체크리스트 점검

현장에서 비계를 사용할 때는 체크리스트를 통해 안전 점검을 실시해 주시기 바랍니다. 체크리스트에는 비계의 설치 상태, 고정 상태, 안전 장치 작동 여부 등을 포함해야 합니다.

4. 당부의 말씀

안전은 모든 작업자의 생명과 직결되는 중요한 사항입니다. 모든 현장에서 안전 수칙을 철저히 준수하여 사고 없는 안전한 작업 환경을 만들어 주시기 바랍니다. 귀사의 협조가 절실히 필요합니다.

※안전기준 미흡 시 패널티 벌금 적용, 3회이상 적발시 현장에서 퇴출되며

귀사의 모든 공종에는 참여 할 수 있음을 알려드립니다.

위 내용은 전체현장의 안전을 위해서 시행하는 바이니 반드시 지켜주시고, 사고 없는 현장이 될 수 있게 모두의 노력이 필요합니다.

더 존 하 우 징
대표이사 이 용 진



- 말비계(우마)/사다리/이동식 비계
안전기준 전파
- 업체준비 : 말비계(우마) / 사다리
- 본사준비 : 이동식 비계
- 기준 미달 자재 현장 반입 금지
- 기준 미달 자재 사용시
 1. 업체 패널티 부과
 2. 현장소장 패널티 및 경위서
- 이동식 비계
 1. 본사 자재 먼저 사용
 2. 부족시 인근현장에서 임대 사용

1. 전파사항

건축공사부

- 건설안전특별법 - (6/27법안발의)

내 용 : 사망사고 발생 시

- 시공사 페널티

매출액 최대3% 벌금 및 영업정지 1년


- 발주자, 설계자, 시공사, 감리자 페널티

7년이하 징역, 1억원 이하 벌금

※ 사고발생 원인에 따라 각각의 건축공사 참여자에게도
페널티가 부과되는 법안 발의됨.

1. 전파사항

건축공사부



보도자료

다시 대한민국!
새로운 국민의 나라

보도시점 2025. 3. 11.(화) 14:00 (2025. 3. 12.(수) 조간)

2024년 산업재해 현황 부가통계 “재해조사 대상 사망사고 발생 현황” 잠정결과 발표

- 2024년(누적) 재해조사 대상 사고사망자는 589명(553건)으로
전년 598명(584건) 대비 9명(1.5%), 31건(5.3%)이 감소
 - (업종별) 사망자 수 기준 전년 대비 건설업 감소, 제조·기타업 증가
 - ▲ 건설업 276명(272건)으로 27명(8.9%), 25건(8.4%) 감소
 - ▲ 제조업 175명(146건)으로 5명(2.9%) 증가, 19건(11.5%) 감소
 - ▲ 기타 138명(135건)으로 13명(10.4%), 13건(10.7%) 증가
 - (규모별) 전년 대비 50인(억) 미만은 감소, 50인(억) 이상은 증가
 - ▲ 50인(억) 미만은 339명(333건)으로 15명(4.2%), 12건(3.5%) 감소
 - ▲ 50인(억) 이상은 250명(220건)으로 6명(2.5%) 증가, 19건(7.9%) 감소
 - (유형별) 떨어짐, 부딪힘은 감소, 물체에 맞음, 끼임, 화재·폭발은 증가

1. 전파사항

건축공사부

○ 「떨어짐」 227명(38.5%) 「부딪힘」 50명(8.5%)으로 전년 대비 각각 24명(△9.6%), 29명(△36.7%) 감소

○ 「물체에 맞음」 83명(14.1%), 「끼임」 66명(11.2%), 「깔림·뒤집힘」 46명(7.8%)으로 전년 대비 각각 16명(+23.9%), 12명(+22.2%), 3명(+7.0%) 증가

* 기타 ▲(화재폭발) 44명(+14명 46.7%) ▲(감전) 22명(+12명 120.0%) ▲(빠짐익사) 12명(+6명 100.0%) 등

구분		총계	떨어짐	끼임	부딪힘	깔림·뒤집힘	물체에 맞음	기타
사망자수 (명, %)	'23년	598	251	54	79	43	67	104
	비율	100.0	42.0	9.0	13.2	7.2	11.2	17.4
	'24년	589	227	66	50	46	83	117
	비율	100.0	38.5	11.2	8.5	7.8	14.1	19.9
	증 감	△9	△24	+12	△29	+3	+16	+13
	증감율	△1.5	△9.6	+22.2	△36.7	+7	+23.9	+12.5
사망사고 건 수 (건, %)	'23년	584	249	54	79	43	67	92
	비율	100.0	42.6	9.2	13.5	7.4	11.5	15.8
	'24년	553	227	66	50	43	83	84
	비율	100.0	41.0	11.9	9.0	7.8	15.0	15.2
	증 감	△31	△22	+12	△29	0	+10	△8
	증감율	△5.3	△8.8	+22.2	△36.7	0	+23.9	△8.7

2025년 안전사고

3. 안전사고

건축공사부

- 안전사고(낙상) -

원 인 : 우마에서 추락하여 어깨 인대 끊어짐 사고

재발방지 : 작업 전 우마사용에 대한 안전교육 실시 및 불안전요소 사전 파악하여 제거 필요

사 고 유 형	낙상	사 고 부 위	어깨
발 생 원 인	실족, 주의 소홀		

사고 현장 사진



3. 안전사고

건축공사부

- 안전사고(열상) -

원 인 : 우마에서 내려오다가 디딤판을 밟고 미끄러져 문틀에 귀볼 열상 발생

재발방지 : 작업 전 우마사용에 대한 안전교육 실시 및 노후화된 작업 발판 현장 반입금지/사용금지

사 고 유 형	미끄러짐	사 고 부 위	긁볼
발 생 원 인	주방타일 줄눈닦고 작업발판을 내려오다 미끄러짐		

사고 현장 사진



안전기준메뉴얼

건축공사부

- 손가락 협착 -

- 발 생 : 킨텍스 모델조립 중 모듈에 손가락 끝 끼임 발생
- 부 상 : 손가락 끝 골절 및 피부 열상
- 대 처 : 사고 즉시 인근 병원으로 이동
손가락 끝 인공뼈 수술 진행
- 재발방지 : 모든 공종에 위험요소를 파악하고 작업자에 해당 내용 교육

