

- 2025 년 01월 소장 교육 -

- 1. 공도구 관리 및 망실 처리 방안
- 2. 이동식 화장실 반납 관리
- 3. 포터 차량 수리 방침
- 4. 내부도어 발주 양식 (적용사항)
 - 용달 배차 관련 안내 (발주방 안내문공지)
 - 본사 지급자재 관리방안 (발주방 안내문공지)
 - 본사 내 폐기물 처리 방안 (발주방 안내문공지)

1. 공도구 관리 및 망실 처리 방안

- 망실 발생시 증거사진 제출 / 미제출시 개인공제
- 분기별 망실조사
2025년 1분기부터 공도구 망실여부 분기별 조사 실시.
망실 발생일 및 내용기재하여 보고.
- 원인 파악 및 대책
망실시 발생 시점 및 원인을 명확히 기록하여 향후 동일 문제에 대한 예방

2. 이동식 화장실 반납 관리

- 반납 시 청소 확인 필수
- 이동식 화장실 반납 시 청소 여부를 확인할 수 있는 사진을 필히 첨부.
청소 미 실행 시 다음 이용자에게 큰 불편을 초래할 수 있음.

3. 포터 차량 수리 방침

■ 본사 방문 시 매봉 카센타 수리요망

- 타 업체 이용 시
- 오일 교체 : 80,000원
- 라이닝 교체 : 80,000원
- 배터리 교체 : 80,000원

기준에 크게 벗어나지 않는 선에서 수리 요망

* 타이어 교체 또한 사고등을 제외하고, 본사 앞 타이어 아울렛 이용 요망

* 매봉카센터 이용시 항시 배터리 상태점검 요망

4-1. 내부도어 발주 양식 적용사양

Door 발주서										화성)더존(하우징,종합건설)/ 화성 봉담		왼쪽하단 현장명 작성시 자동 적용			
NO	위치	배치	미달이 여달이	문틀 치수	수량	문짝(도어)	색상	발포	본리형 식기	ABS	도어 크기	달기는	비고	옛지	실타
1	도면상 위치 표기	WD1	개폐 방식 표기	가로 길이	높이	문틀 폭	인테리어 최종 도면 기준 내용				가로 도어 길이 높이	우 경첩	도어 크기 (문짝 사이즈) * 여달이 도어 기본 사이즈 900*2100*		
2	1층 침실1	WD2	여달이	1500	2100	180	ya-07	영림 50					▶ 가로 길이 : 문틀 가로 길이 -67mm L예) 900문의 경우 가로폭 833mm		
3	1층 서재		미달이	900	2100	180	yd-1000	ps120					▶ 마루측 문짝높이산출(일반방문) (방통에 밀착시공 (문틀밑으로마루끼움없음을 기준) 2100 - 문틀30 - 여유상하6mm(3+3)-10mm(마루7+본드3) = 2054문짝높이 (단, 마루제품이 두꺼워지는경우 문짝높이 사이즈 조절)		
4	1층 안방		포켓도어										▶ 욕실문 문짝높이산출 (무조건 인조대리석을 문틀밑으로 끼워시공) 2100mm-12mm = 2088 (문틀사이즈) 문틀30-여유상하6mm(3+3) = 2052문짝높이		
5	1층 창고		3연동										▶ 포켓도어 문짝 기본 사이즈 문틀 현장제작 기준 문틀 가로 길이 / 2 (1800mm 기준 가로폭 900mm) 문틀 높이 에서 / -70mm (2100 기준 2030)		
6	1층 욕실1		양개도어										*레일 2m사이즈 출고->현장가공		
7	1층 욕실2												*양개도어 및 기타도어 미기입		
8	1층 드레스룸														
9	1층 다용도실														
물딩, 템바보 등 수량 기입															
*** 자재 출고시 랩핑면 (박스)에 반드시 위치 명기 바랍니다 ***															
특이사항	경첩		이지경첩 다크그레이	6	조										
	손잡이			YDH-030DG	6	조									
	손잡이				6	조									
	손잡이				6	조									
	도어스토퍼			YDS-03B	6	조									
현장명 간략히 작성															
*실타 하부에서 950mm / *접제문틀 가스켓 / *키홀타공															
담당자	인테리어나답담당자 :														
현장명	화성 봉담														
연락처	현장주소														
워플상 주소 기입															
담당 소장님 연락처															
거실 현관 거실 현관 거실 현관 거실 현관															

4-2. 내부도어 발주 양식 적용사양

Door 발주서										화성)더존(하우징,종합건설)/ 화성 봉담				왼쪽아난 현장명 작성시 자동 적용					
NO	위치	배치	미달이 여달이	문틀 치수			수량	문짝(도어)	색상	발포	분리형	식기	ABS	도어 크기	당기는	비고	옛지	실타	
1	도면상 위치 표기	WD1	개폐 방식 표기	가로 길이	높이	문틀 폭		인테리어 최종 도면 기준 내용							우 경첩	* 비고란 * 인테리어 도면내 내부도어 특이사항 작성 예 : 유리 사양, 슬림와이드 문틀 유,무 등 (슬림와이드 옛지9or12mm / 돌출 10,15,20mm) ▶현재 특이사항 없을경우 20mm돌출 통일.			
2	1층 침실1	WD2	여달이	1500	2100	180		ya-07	영림 50						좌 경첩				
3	1층 서재	WD3	미달이	900	2100	180		yd-1000	ps120										
4	1층 안방		포켓도어					.	.							문짝 : ABS, 멤브레인 유무 ABS : 욕실, 다용도실 등 멤브레인 : 일반 방문 ABS 문짝 필요한 곳만 O 체크 * 제안서내용확인. *식기 : 인조대리석 및 목문식기관련.	당기는 기준 경첩 위치 표기 포켓도어 출입방향 좌->우 주방->다용도실		
5	1층 창고		3연동					.	.										
6	1층 욕실1		양개도어					.	.										
7	1층 욕실2															문틀 종류 발포 : ABS (욕실 등 물 사용 공간)- ↳보강재로인해 현장사이즈조절불가능 분리형 : 집성 목재 (일반실) 해당 위치 O 체크	식기 유무 O,X 표시		
8	1층 드레스룸																		
9	1층 다용도실																		
*** 자재 출고시 랩핑면 (박스)에 반드시 위치 명기 바랍니다 ***																			
특이 사항	경첩			이지경첩 다크그레이			6	조											
	손잡이			YDH-030DG			6	조											
	손잡이			YDS-03B			6	개											
	도어스토퍼			YDS-03B			6	개											
	도어스토퍼							개											
	자석캐지																		
현장명 간략히 작성 *실타 하부에서 950mm / *전체문틀 가스켓 / *키홈타공 담당 소장님 연락처																			
담당자	인테리어담당자 :								연락처	워플상 주소 기입									
현장명	화성 봉담								현장주소										



- 2025 년 02월 소장 교육 -

- 1. 본사지급자재 신규품목
- 2. 기타전달사항

1. 본사지급자재 신규품목

- 바이오 실리콘 – “회색” 색상추가운영
- 노 크랙 – 방통 크랙 방지용 철물 추가운영.

2. 기타전달사항

- 골조자재 발주시 신규 양식에 맞춰 발주 요망 [발주방 공지참고]
- 이동식 화장실 반납관련 기준 준수 [청소후 사진촬영]
- 본사 방문 전 지급자재 품목 검토하여 요청 [방문 후 명일 택배요청 건 방지]
- 도어자재 입고 시 발주사양과 동일제품인지 확인필수
- 금일 회의 종료 시 “영림, 예림” 카탈로그 + 시트북 샘플 수령
- 영림 : 유튜브 “영림매뉴얼” 검색 시 제품교육자료 확인가능 [제품소개 및 시공교육]
예림 : 책자 카탈로그 뒷 면 QR코드로 설명서 및 시공법 확인가능.

- 2025 년 04월 소장 교육 -

- 1. 차량 엔진오일 교체주기
- 2. 본사폐기물처리지침
- 3. 발주관련 유의사항

1. 차량 엔진오일 교체주기

-  단거리 운행 위주 차량:
5,000 ~ 7,000km 주행 시 교체
-  장거리 운행 위주 차량:
10,000km 이내 교체.

※ 원활한 차량 운영과 엔진 수명을 위해 반드시 준수하여 주시기 바랍니다.

2. 본사 폐기물 처리지침

- 본사 단열재 폐기시 **“비닐 밀폐 포장”** 하여 배출 -> 암롤옆배출
※비밀포장 아닐 시 배출 불가
- 본사 폐비닐 폐기시 **“비닐 밀폐 포장”** 하여 배출 -> 인근 주민의 민원발생.

3. 발주관련 유의사항.

- 도어자재 발주시 - **“문틀 후레임 치수”** 현장 목구조 마감사이즈 검토 후 적용.

예) 기존문틀 “180바” 발주 후 “170바or130바 ” 변경
재발주로 인한 공기 지연 및 금액적 손실 발생고려

- 세라믹데크 발주 - 시공팀의 **“물량산출도면”** 필히 첨부하여 발주.

잔여재고 발생시 ▶ 본사재고품 으로 보관운영 ▶ 시공예정현장 “선출고” 재고처리
소장님 창고방문시 재고현황 확인하시어 직접수령 하시기 바랍니다.

※ 에스알펜스터 직발주 금지 / 자재부로 물량산출도면 + 제품품번사진 첨부하여 발주

- 본사 발주 품목 **“발주단톡방”** 으로만 요청바랍니다.

개인 카톡요청시 다량의 카카오톡 단톡방 개설로 발주 누락이 될 수 있습니다

2025년 6월 소장교육 / 자재

1. 도어발주 관련 유의사항
2. 재발주 사례

1. 도어발주 관련 유의사항 (침실도어)

▶ 침실방문 (바닥 / 마루마감) / 900*2100기준

* 타일마감시 타일 두께에 따라 문짝 세로 높이 조정 (가로폭=고정)

- 문틀 : 900*2100*180 (문틀바수 = 5단위 조정가능)

- 문짝 : 833*2054

- 가로 : -67 (고정) (좌우문틀60+좌우여유7)

- 세로 : -46

※ 세로높이 = 높이 - (문틀30mm + 마루10mm + 상부여유 3mm + 하부여유3mm)

1. 도어발주 관련 유의사항 (욕실도어)

▶ 욕실문 (도어식기=인조석마감)

* 물턱형 식기 적용시에도 문짝 세로높이 사이즈동일계산. (가로폭=고정)

- 문틀 : 900*2088*210 (발포문틀바수 : 175,195,210 ~ (규격화))

물턱만큼 하단부매립하여 시공하였을 경우 2100 높이 동일 적용하여야 침실방문과 문틀상단부의 높이 맞춤


- 문짝 : 833*2052

*인조석 하단부매립하여 물턱끝이 내부바닥과 일치할경우
문틀 900*2100 적용하여 문짝 833*2064 (침실방문과 문틀상단부 높이 맞춤)

- 가로 : -67 (고정)) (좌우문틀60+좌우여유7)

- 세로 : -36

※ 세로높이 = 높이 - (문틀30mm + 상부여유 3mm + 하부여유 3mm)

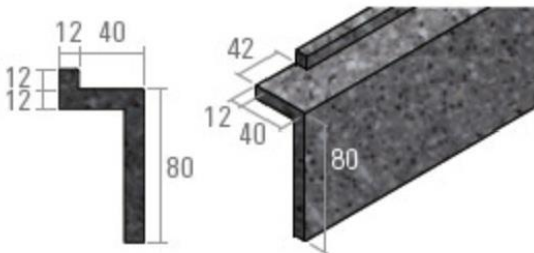

2. 도어 재발주 사례 (1)

▶ 문짝 사이즈 현장계산오류

- 내장팀과 협의하여 기존 사이즈 외 발주요청시 재차 검토하여 전달요함.
- 구조재사이즈 관련 현장여건 반영하여 문틀바수 선정

※재발주 사례

※주 발생장소 : 계단하부창고 / 현관수납도어

※문틀바수 180바 -> 130바 변경 재발주건 발생

▶ 설치문제

- 현장 문틀 설치시 문틀을 띄워 설치하면서 하단부 빈공간 발생
- ※ 문틀 문짝 전부 재발주 하는 문제 발생할 수 있음.

▶ 욕실도어사이즈

- 욕실 외 방문사이즈와 동일 계산식으로 설치 후 10mm 뜨는 문제발생

▶ 걸레받이 종류 확인

- 기성걸레받이 -> 라운드형 / 평몰딩 -> 직각
- 제안서상 걸레받이 종류 기재되어있으니 꼭 확인하시고 발주요청.

2. 도어 재발주 사례 (2)

▶ 현장 사이즈 조정

- 현장에서 임의로 대패가공 하여 설치 후 엣지필름 작업 -> 필름 들뜸 및 마감불량발생.

※임인가공 후 매끄럽지 않은 마감불량에 대한 AS요청 권 처리불가

※제품 설치 전 사이즈 체크하여 시공 요함

※사이즈 “제작불량” / 미설치보관 -> AS요청 (사이즈 불량사진촬영 전송)

▶ 제품도착 후 수량파악 필수.

- 상차 목록에 기재되어 있으나 현장 미 도착 시 즉시 확인하여 업체측 출고요청

※ 시간경과후 부족수량 발생 시 / 목록에 기재 되어있어 재 구입 문제 발생.

▶ 보양 미흡 및 공정 중 파손

- 해당 공정에 따른 업체별 마감후 검토 / ※공정 전, 후 상태확인
- 사유를 알수 없는 파손 발생 방지 및 빠른 교체시공

2025년 7월 소장교육 / 자재

1. 바이오 실리콘 운영현황

1. 바이오 실리콘 운영 현황

▶ 본사 보유자재

1. 탑셀 - 바이오 반투명 / 백색 / 흰색

2. 기타색상

- 아래 색상표 참고해서 발주방에 올려 주시면 별도로 업체에서 배송가능.



2025년 9월 소장교육 / 자재

1. 바이오 실리콘 / 아덱스 실리콘 운영 현황
2. 본사 발주 (브랜드 타일 적용 현장) 기본 사항.
3. 본사 발주 (브랜드 타일 적용 현장) 발주요청시 사전확인.

1. 바이오 실리콘 / 아덱스 실리콘 운영 현황

▶본사 보유자재

1. 탑씰 - 바이오 반투명 / 백색 / 회색

2. 기타색상 (아덱스 실리콘) ※아덱스실리콘 : 브랜드타일 자재 줄고시 합침 줄고 가능※

- 아래 색상표 참고해서 발주방에 올려 주시면 별도로 업체에서 배송가능.



*상시운영(경동택배가능)

200화이트

250바닐라

248아이보리

249베이지

277밤부

241라이트그레이

273그레이

223시멘트

211다크그레이

212볼케이노

*해당 품번 외 색상 : 수급가능하나
선 재고확인 후 발주

2. 본사 발주 (브랜드 타일 적용 현장) 기본 사항.

1. 현장배정시 재고확인요청 (단종제품 발생방지 및 대책안마련)

2. 1차, 2차 나누어 출고진행. (일정 검토하여 발주시 전달)

- 1차 : 타일 / 인조석 / 부자재 (위생도기 및 수전류 제외한 나머지 부속자재)
- 2차 : 위생도기, 수전

(별도출고 : 샤워부스 시공위임권 (프레임형의 낮은벽 파티션 및 욕조 위 파티션 포함)

(1 차 : 레미탈 포함 40kg (1 PT=50포) 포함출고) / 잔량추가불가 (부족시 가격비교 현장수급)

3. 타일시공일 3주전 발주요청

- 타업체 수급품목 or 선입금 후 제작품목의 처리기한 발생고려.
- 품목이 간단해도 필히 3주 납기준수


4. 준공서류 (기존과 동일 / 업체 + 본사 동시요청)

- 본사 대림발주분 : (발주방요청) 전일과장 출고내역확인 후 류지은대리 서류작성회신.
- 대림발주분 외 품목 : 브랜드타일 손예진대리 : 010-8510-1579

3 본사 발주 (브랜드 타일 적용 현장) 발주요청시 사전확인.

1. 인조석 발주 사이즈 검토하여 회신 (외경사이즈 기준.)

- 물턱형 옥실식기 적용 현장 인조석 길이 매우 중요
(물턱이 올라오는 구간 규격이 정해져있음)
- 그 외 인조석 = 길면 제단하여사용
(짧을 시 재발주로 인한 비용발생 / 검토유의)

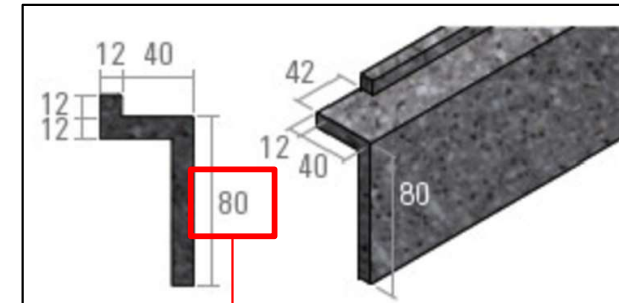

높이조정가능

2. 코너비드 수량 검토

3. 돔천정 적용확인 (메인천정 : 1350*1850 / 날개 700,1000 * 1850)

- 광범위 천정 시 천정보강작업과 관련하여 재단 사이즈문제가 있을 수 있음을 염두하여 설비팀에 자재구비 유무를 확인하여 회신 바랍니다.
- 설비팀에서 구비할 시 발주 품목에서 제외출고

4. 샤워부스, 주문제 제작 하부장등

- 실측이 필요한 품목은 "브랜드타일" 담당자와 협의하여 사이즈 및 입고일 조정

2025년 10월 소장교육 / 자재

1. 본사 발주 (브랜드 타일 적용 현장) 발주요청.
2. 샤워부스 제작 전 현장실측.

1. 본사 발주 (브랜드 타일 적용 현장) 발주요청.

▶ 본사 발주 단톡방 요청

- **1차** 검토 - 인테리어 담당자 / 견적이후 변경된 건축주 협의권 검토
- **2차** 검토 - 류지은대리 / 1차 검토후 전달받은 내용 반영한 2차검토진행. -> 최종 발주리스트
 - 현장소장 / 인조석 사이즈 검토회신. (2차검토완료 후 연락드립니다)
- **3차** 검토 - “브랜드타일” 발주마감. (발주처리 이후 협의 : 손예진대리)

▶ 입고일정 1차, 2차 분리출고.

- 1차 : 타일 / 인조석 / 부자재 + 매립수전 및 욕조자재
- 2차 : 1차 외 나머지전체품목.

※샤워부스, 제작하부장 = 브랜드타일 담당자 협의 (손예진대리 : 010-8510-1579)

▶ 준공서류 (본사발주방요청)

- 본사지급(대립) - 자재부 > 현장소장회신.
- 브랜드 수급품목 - 자재부 > 브랜드 > 현장소장회신.

2. 샤워부스 제작 전 현장실측.

1. 실측 목적

- 정확한 치수 확인을 통한 제작오차 및 설치 불량 방지
- 현장 여건(타일, 배수, 문틀 등)에 맞는 맞춤 제작 가능
- 품질 향상 및 A/S 최소화

2. 실측 기본원칙

- 가로/세로/높이를 모두 측정 (입면도상 코너발생시 상세하게 기록)
- 각 면 **상단, 중단, 하단 3곳** 이상 측정 후 평균값 사용
- 수평/수직 오차 여부 확인 ($\pm 3\text{mm}$ 이상 시 조정 필요)

3. 주요 실측 포인트

•A. 샤워부스 설치 위치

- 코너형, 일자형, ㄷ자형 구분
- 벽면 타일마감 상태 확인

•B. 문 위치 및 여닫이 방향

- 외개/내개 구분
- 개폐 간섭 확인 (변기, 세면대 등)

실측 기록 예시

항목	실측값(mm)	비고
좌벽~우벽 하단	1,195	타일 하단 기준
좌벽~우벽 중단	1,198	
좌벽~우벽 상단	1,200	
벽 높이	2,050	
바닥 기울기	약 2.5°	배수구 방향
문 여는 방향 (미는기준경첩방향)	우경첩	수전 간섭 없음


4. 결론

- 정확한 실측이 **제작 품질과 설치 완성도**를 결정
- 항상 "3회 이상 확인" 원칙 준수
- 더존하우징의 품질 기준은 **정확한 실측**에서 시작합니다.

실측 기록 예시



실측 기록 예시

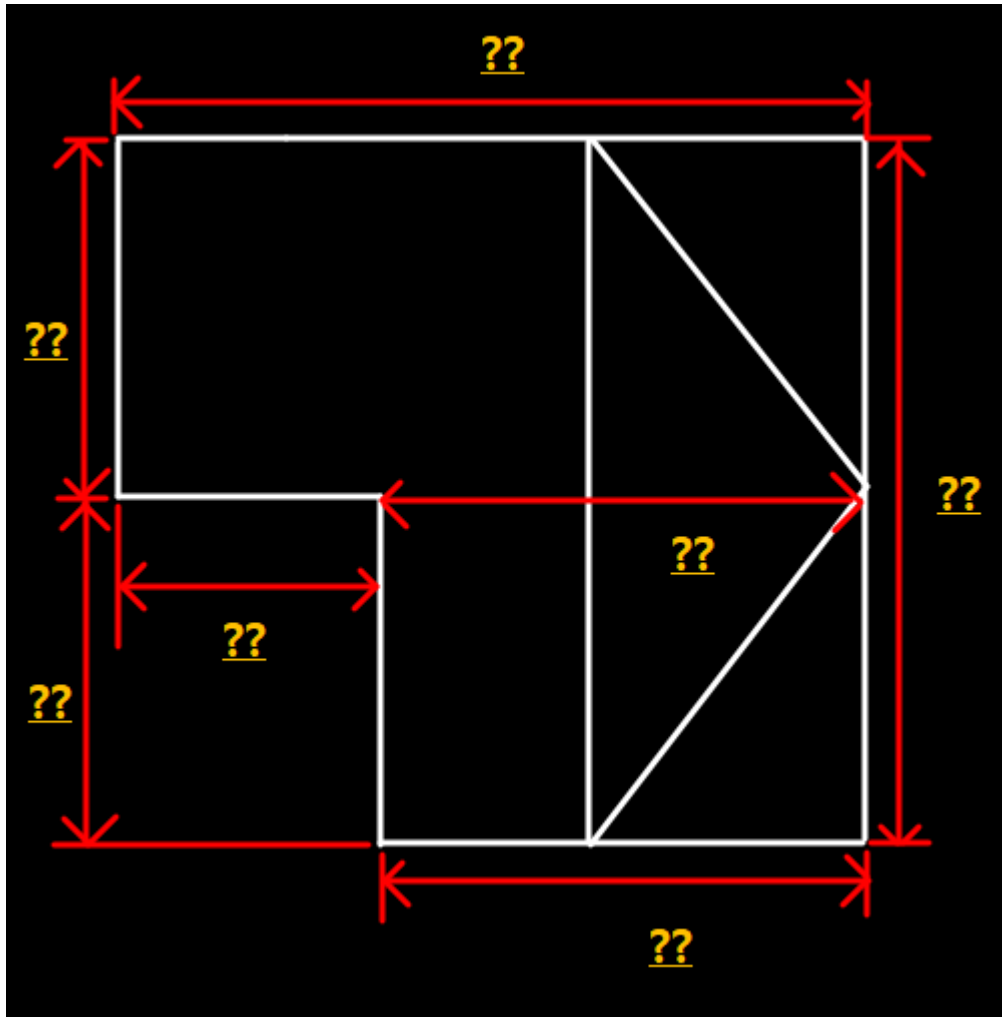

◎ 기록

- 최대한 많은부위 실측
- 도어오픈관련 내부간섭 유의
- 현장 마감상태의 사진촬영 후
사이즈 표기 발주 가능.
- 도면으로 표기 발주 가능.
