

2026 공사부 슬로건

계획은 스마트하게!

업무는 AI처럼!

안전은 완벽하게!

- 2026년 9월 18일 현장소장 회의 및 교육 -
- 장 소 : 본사 5층
- 시 작 : 직영소장 12시 30분 (차량 및 공도구 점검) ~
관리소장 13시 ~
- 시 간 : 12시30분 직영소장 차량, 공도구 점검
13:00 ~ 13:30 - 대표이사 훈시
13:30 ~ 15:30 - 감리교육 진행
15:30 ~ 15:50 - 휴식
15:50 ~ 17:00 - 공무 교육

전 파 사 항

- A/C박스 시공 시 넓게 시공 -

- 목 적 : 현재 A/C박스 시공 방법은 A/C 실내기 설치 시 간섭이 발생되고 있어 실내기 연결부분에 마감이 좋지 않아 에어컨 박스를 넓게 시공하는 방법 변경




- 후레싱 물끊기 -

- 목 적 : 수벽 두겹, 파라펫 두겹 모두 물끊기를 통해 목골조 누수 방지



- 장애인시설 법규 -

- 목 적 : 최근 근생현장도 많아지면서 장애인시설관련 법규 내용 확인 필요

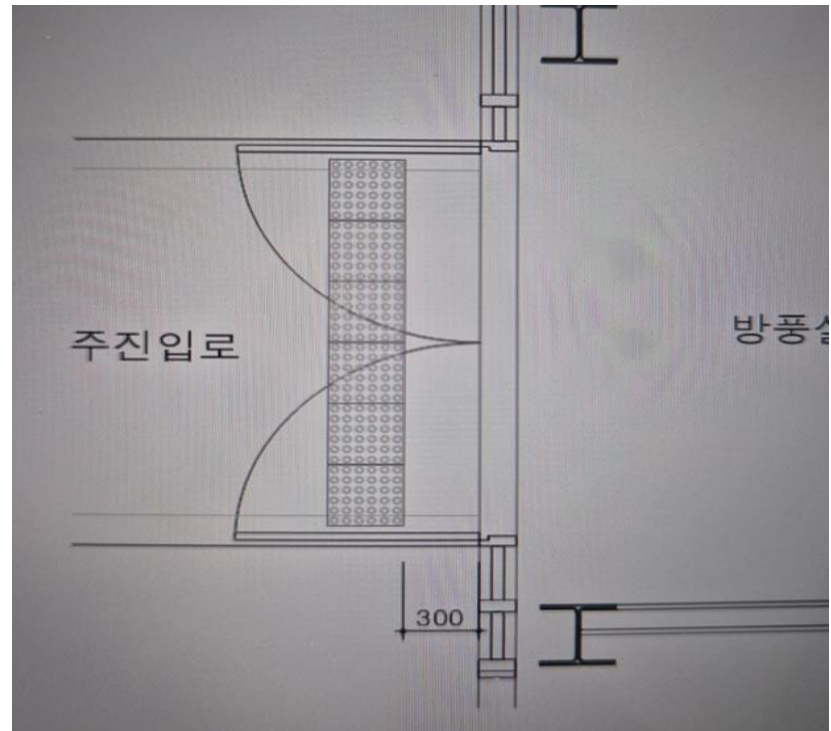

- 장애인시설 법규 -

- 주출입구 점형블럭 : 문 전면 300mm 이격
- 점형블록 폭 : 문의 폭 만큼
- 점형블록 표준크기 : 300x300mm
- 경사로 유효폭 : 1200mm이상
- 경사로 기울기 : 1/12 이하
- 경사로 휴식참(수평) : 높이 750mm 이내마다
- 경사로 활동공간 : 1500 x 1500mm 이상
- 경사로 추방방지턱 : 50mm 이상
- 벽 설치 손잡이(벽간격) : 약 50mm
- 손잡이 높이 : 800~900mm
- 손잡이 지름 : 32 ~ 38mm
- 출입문 통과 유효 폭 : 900mm이상
- 출입문 전면 유효 거리 : 600mm이상
- 비자동문 측면 활동공간 : 600mm이상
- 출입구 문턱/높이차 : 없음

- 목조주택 화재 사고 -

- 19년 완공 된 주택에 전기로 화재 발생
- 보수 계획 : 지붕 구조재 손상 및 소화로 인해 내부 천장 무너짐 및 벽, 바닥 손상 전반적인 마감 필요





이슈 사항

- 허가도면과 시공도면 차이 -


- 원 인 : 1. 기초착공 공사 중 암반으로 터파기 하다보니 넓게 터파기 되어 건축주에게 레미콘 물량 추가되는 부분 설명하였으나 건축주는 납득을 못해 클레임 발생
2. 현장소장님은 설명 하였다고 하나 건축주는 충분히 이해하지 못했음
건축주가 못알아듣는 거라고 현장소장은 이야기함
- 처 리 : 현장에서 건축주 만나 차분히 설명하니 이해하고 수긍하심
처리과정에서 도면 검토 중 건축사가 회사 최종도면을 보고 최종이 아니라고함
담당자확인결과 건축사에게 허가 중 변경이 된 도면을 전달 받지 못하고
내용 또한 듣지 못했다고함
(변경내용 중앙선기준으로 주차장이 6m이격이 필요한데 그러지못해 변경)

- 허가도면과 시공도면 차이 -

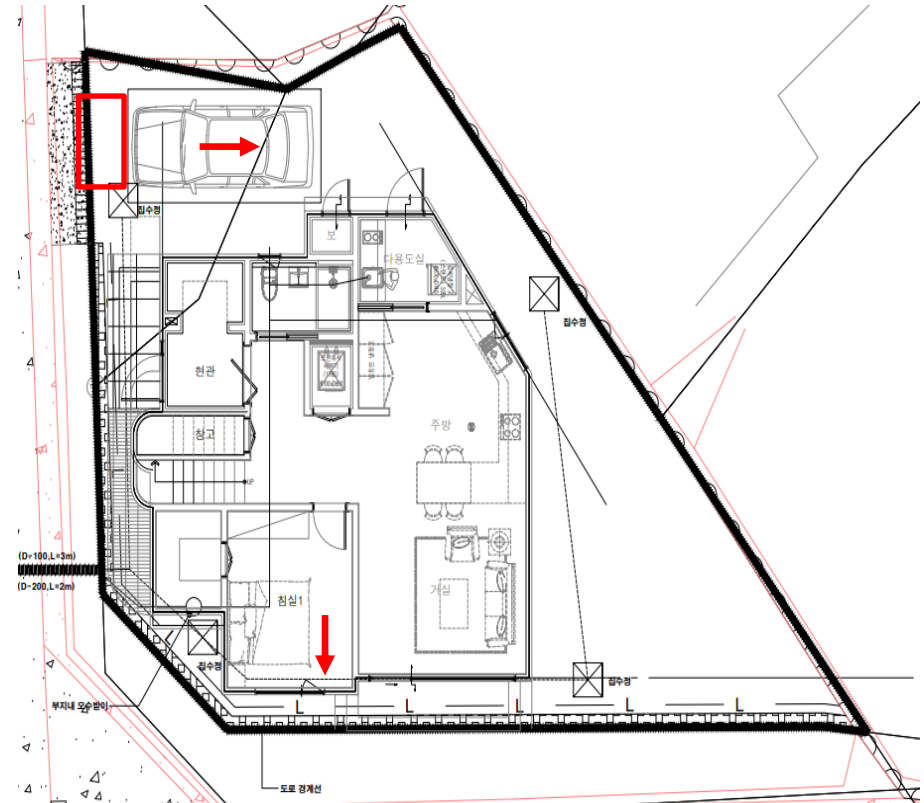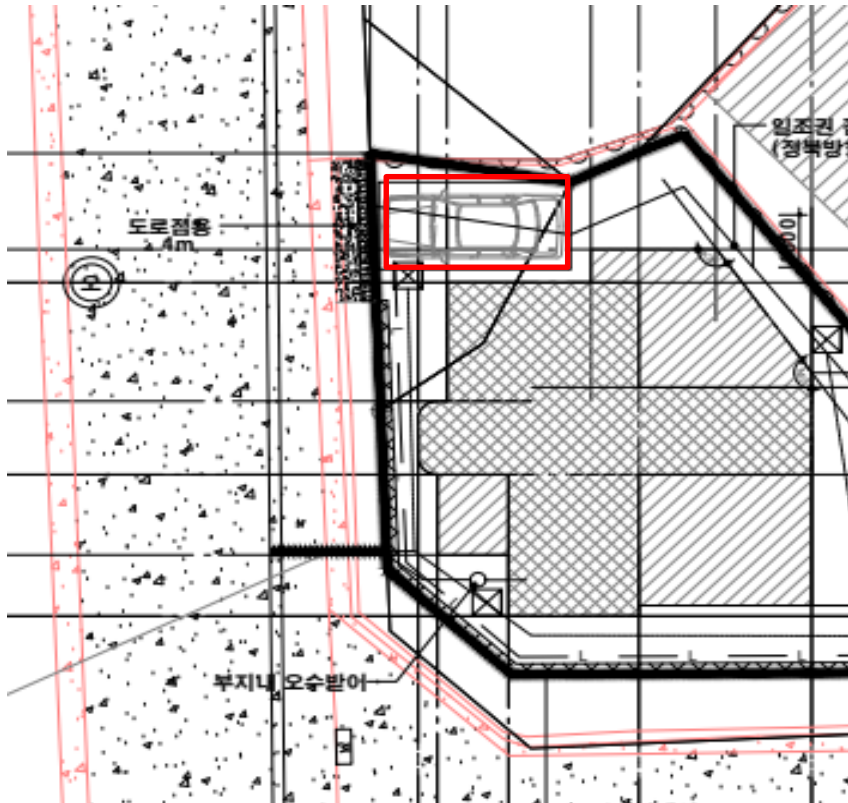


- 구조도면, 시공도면 차이-

- 원 인 : 시공도면과 구조도면의 개구부 위치 차이
R.C, 목조모두 골조 시공 시 구조도면을 토대로 시공
최초 계획으로 구조도면이 나왔지만 이 후 인테리어, 가구 등 이유로 인해
개구부위치 변경되었는데 구조도면에는 반영되지 않음
- 처 리 : 기존 벽 철거 후 개구부 이동 계획
- 금 액 : 100만원
- 재발방지 : 설계부서의 도면 획일화 필요 / 시공전 도면 검토 필요

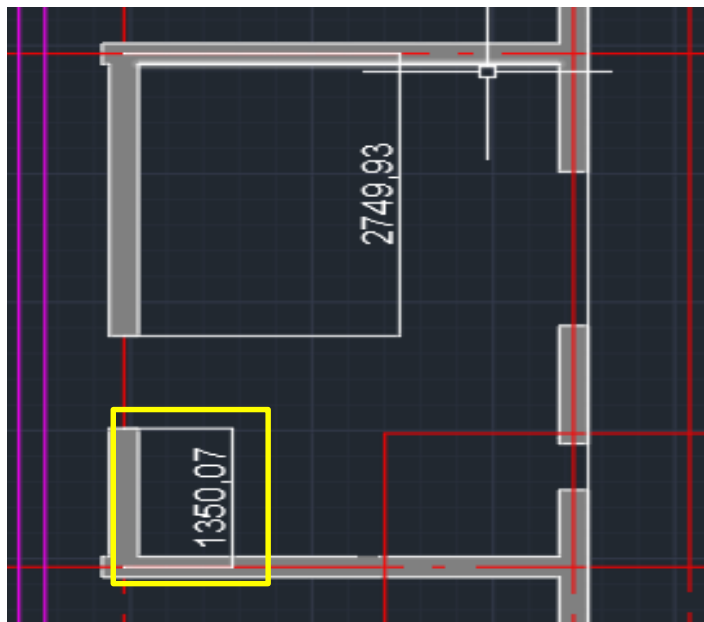

구조도면

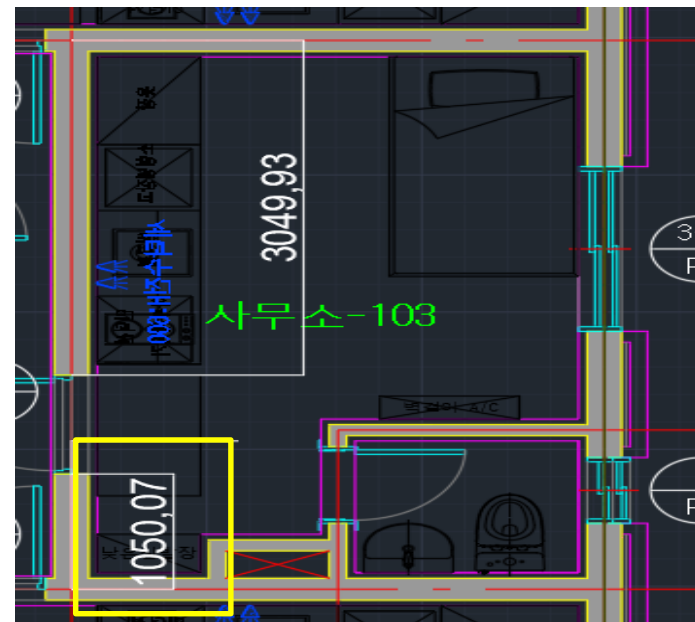


시공도면

- 우천, 강풍으로 인한 누수 -

- 원 인 : 강한 우천 및 강풍으로 벤트로 우수 유입
- 처 리 : 해당부분 지붕 마감 후레싱 하부 물막이 시공
- 재발방지 : 많은 우수가 떨어지는 부분에 대해 벤트 타공 X OR 과도한 벤트 타공 X
필터 폼 사용해 우수 유입 차단




건축공사부

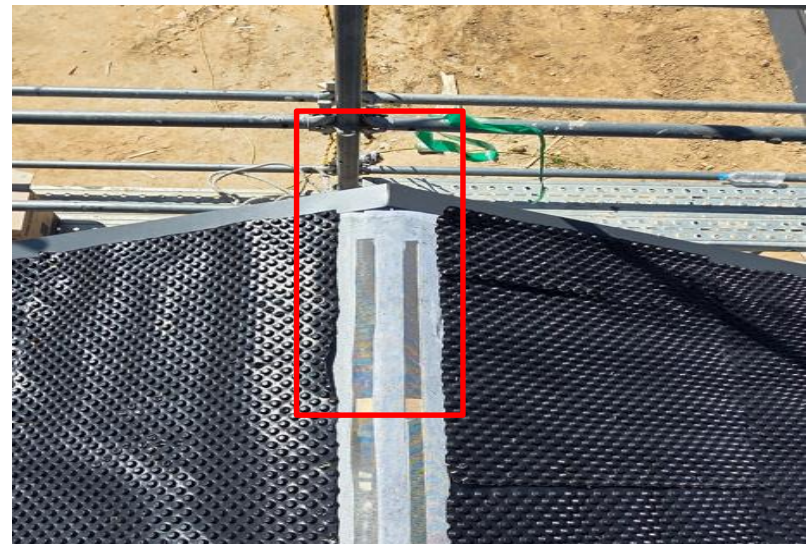

- 계단 헤드월 간섭 -

- 원 인 : 건축 단면도상은 높이가 확보가능한데 마감하면 높이 나오지 않음
헤드월 2P (20mm) / 계단 마감재 디딤판 철판 일체형 (30mm)
- 처 리 : 공사 중 찾아 천장높이 조정하여 해결
- 재발방지 : 모든 현장 계단 단면도 작성되어 마감높이 고려한 계획 필요

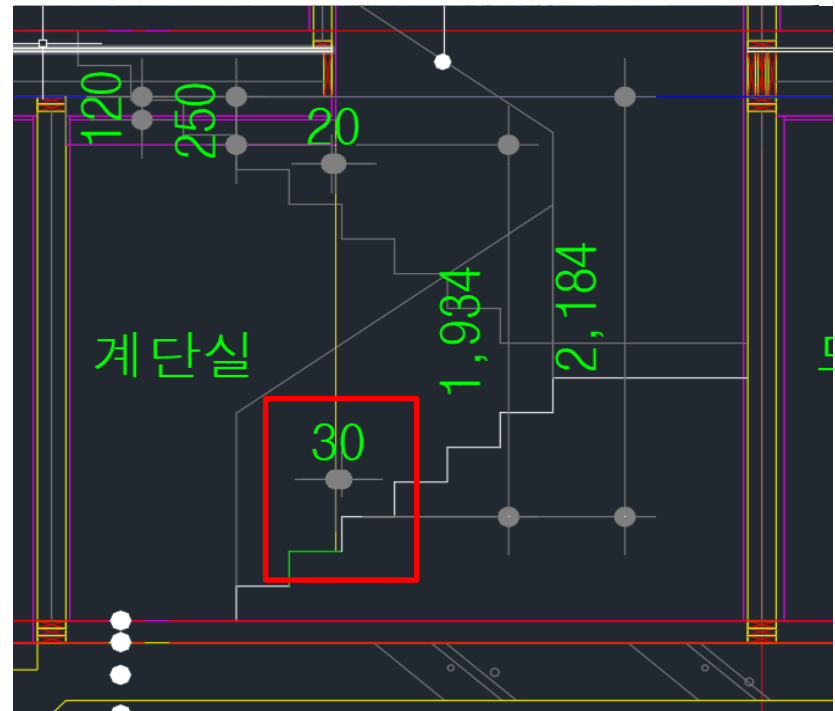

- 보일러 연도 변경 -

- 원 인 : 옆집 건축주가 보일러 연도가 본인 집앞에 보인다는 이유로 이동 클레임
- 처 리 : 보일러연동 이동
(법적문제는 없으나 앞으로 남은 공종, 건축주와의 관계등을 고려해 이동)
- 금 액 : 외장, 내장, 보일러, 전열교환기 4공종 비용 발생 금액 협의 중



- 감리지적사항 확인사진 부족 -

- 원 인 : 감리시 방수шит 젖어 건조 후 쉬트방수 시공 지시
건조한 사진 자료 없음
- 처 리 : 쉬트방수 철거 후 재시공
- 금 액 : 100만원
- 재발방지 : 감리시 지적된 부분 처리사진자료 없을 시 재시공 발생
그로 인해 발생한 부분은 현장소장 책임



- 바닥 OSB 시공으로 마감재 변형-

- 원 인 : 갤러리루바 설치 및 고정을 위해 바닥에 OSB합판시공 하였는데 OSB합판이 부풀어 올라 타일 들뜸 발생
- 처 리 : 바닥 OSB합판 제거 후 마감 진행
- 금 액 : 45만원
- 재발방지 : 하지관련 변형 유무 판단해서 작업진행 필요



- 변기 재설치 -


- 원 인 : 건축주 변기사용 시 배변이 잘 내려가지 않는다고 a/s접수
- 처 리 : 설비업체와 감리 현장에서 변기 재설치 중
건축주는 변기 부속을 잘 못 시공하여 생긴 문제라고 생각해
새로운 부속으로 교체하여 처리 함

며칠 후 건축주는 다른변기도 똑같은 시공이라고생각되 멀쩡한 변기도
철거 후 본인이 원하는 방식으로 오수배관주변 방수보강 후 3일 양생 후
변기 재설치 요청

- 문 제 : 건축주는 현장소장의 최초 응대에 불만족스러운 부분 있어 다고 함
기술자는 오지 않고 현장소장만 와서 휴지로 물만 내려보내고
괜찮다라는 등의 무성의한 점검에 화가 나셨다고 함

문제 발생 시 최초 현장소장님들의 대처가 중요함
건축주의 목적을 정확히 파악하고 대응이 필요하며, 원만한 대응이 어려울
경우 해당내용으로 내부적 회의를 통해 응대 필요

- 변기 재설치 -

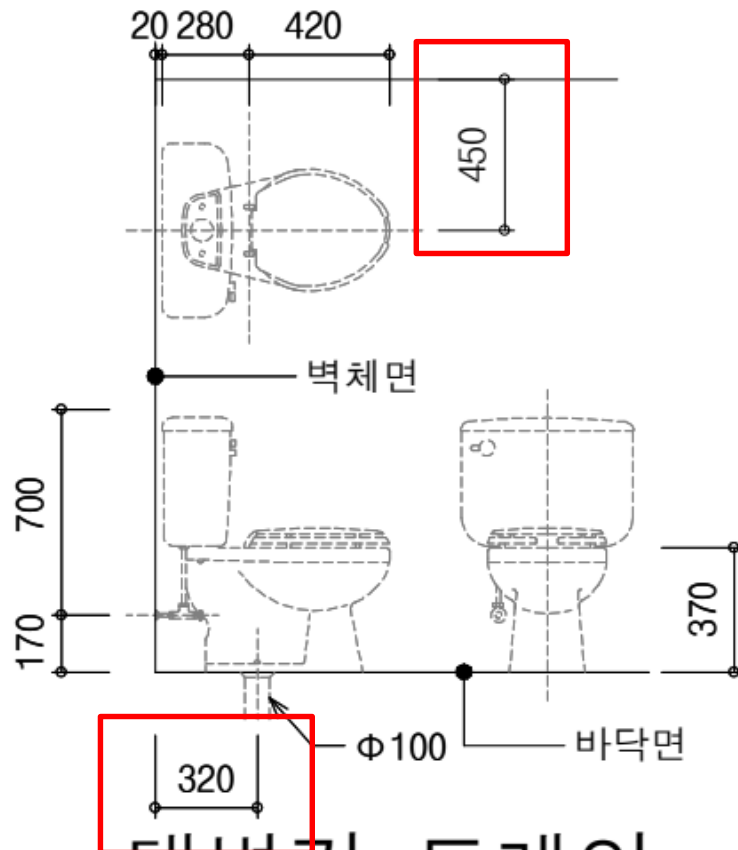

대변기 드레인

- 블랙 컨슈머? 불만? 대처 -

1. 먼저 '블랙컨슈머'와 정상적인 불만을 구분하세요

현장소장이 가장 먼저 해야 할 것은 고객의 요구를 감정이 아니라 행동 기준으로 판단하는 것입니다.

상황	현장소장 대응
실제 하자가 있음	즉시 확인 → 원인 → 조치계획
품질에 대한 정당한 지적	인정하고 기록
단순히 마음에 들지 않음	계약·도면·샘플 기준으로 판단
시공 후 추가 요구	추가공사 여부와 비용 안내
같은 문제를 반복적으로 제기	기존 답변 및 조치내용 문서화
이미 합의한 내용을 계속 변경	변경사항을 서면 확인
과도한 보상 요구	근거자료 요청
폭언·협박·모욕	대화 중단 및 공식적인 방식으로 대응
다른 업체/온라인에 공개하겠다는 압박	감정적으로 대응하지 말고 사실관계 기록

중요한 것은 "고객이 화났는가?"가 아니라 "그 요구에 계약상·시공상 근거가 있는가?"입니다.

- 블랙 컨슈머? 불만? 대처 -

2. 현장소장이 가장 먼저 만들어야 하는 것

「현장 이슈 관리표」 하나를 만드세요.

고객과 문제가 생길 때마다 머릿속으로 기억하면 결국 소장이 지칩니다.

밴드 활용

예를 들어:

날짜	고객 요구	현장 확인	판단	조치	완료일
9/10	거실 바닥 소음	현장 확인	기준 내	고객 설명	9/10
9/11	창호 주변 균열	사진 확인	보수 필요	실리콘 보수	9/12
9/11	벽지 색상 변경	계약사항 확인	추가 요구	추가금 안내	-

이렇게 하면 고객이

“전에 이것도 해준다고 했잖아요.”

라고 이야기해도,

“제가 기억하기로는...”

으로 싸울 필요가 없습니다.

그냥

“확인해 보겠습니다. 당시 협의 내용을 기록으로 확인한 후 답변드리겠습니다.”

라고 하면 됩니다.

이 한마디가 현장소장에게 굉장히 중요합니다.

- 블랙 컨슈머? 불만? 대처 -

3. 고객과 통화할 때 절대 피해야 할 말

특히 화가 난 상태에서는 이런 말을 하지 않는 것이 좋습니다.

❌ “그건 고객님의 잘못 알고 계신 겁니다.”

❌ “원래 다 그런 겁니다.”

❌ “다른 현장도 똑같습니다.”

❌ “그 정도 가지고 왜 그러세요?”

❌ “저희는 해드릴 만큼 해드렸습니다.”

❌ “그러시면 저희도 할 수 없습니다.”

이런 말은 사실관계가 맞더라도 분쟁을 키우는 표현이 될 수 있습니다.

회사는 매월 많은 비용들 들여 광고를 하고 있습니다.

이런 건축주들이 각종 미디어, SNS를 통해 악의적으로 내용이 올라갈 경우 회사에 막심한 손해가 발생될 수 있습니다.

일방적인 소통이 아닌 건축주와 공감형성을 통한 소통이 필요합니다.

안전사고

- 최근 현장 안전사고 -

건축공사부

1. 현장 구조물 인지 부족으로 인한 사고

- 원인 : 이동 중 비계 구조물 인지 지연으로 코뼈 부상
- 사고자 : 경력 3년 미만 근로자
- 휴업기간 : 3주

2. 사다리 사용 작업 중 미끄러짐 사고

- 원인 : 1인 사다리 사용 작업 중 미끄러지면서 손목 골절
- 사고자 : 61세 고령 근로자
- 휴업기간 : 6주

3. 테이블쏘 절상 사고

- 원인 : 테이블쏘 작업 중 손가락 2개 절상
- 사고자 : 경력 2년 미만 근로자
- 휴업기간 : 8주

- 최근 현장 안전사고 -

건축공사부

4. 사다리 사용 작업 중 낙하

- 원인 : 낮은 사다리 최상단에서 작업 중 낙하하여 무릎 골절
- 사고자 : 71세 고령 근로자
- 휴업기간 : 12주

5. 비계 작업 중 낙하물 부딪침

- 원인 : 비계공사 중 발판에 있던 자재가 낙하 하면서 손가락 열상
- 사고자 : 경력 8년
- 휴업기간 : 2주

5. 전동공구 사용 중 절상

- 원인 : 가구공사 중 몰딩 길이방향으로 재단시 전동공구 로 손가락 절상
- 사고자 : 경력 10년
- 휴업기간 : 6주

- 최근 현장 안전사고 -

건축공사부

7. 이동식 비계 사용 중 미끄러져 추락

- 원인 : 도배작업 후 이동식 비계 내려오다가 추락으로 뇌출혈 발생
- 사고자 : 경력 20년
- 휴업기간 : 12주

8. 전동공구 사용 중 절상

- 원인 : 기초공사 중 목재 재단 시 전동공구로 손가락 절상
- 사고자 : 경력 6년
- 휴업기간 : 3주

교육 내용

건축공사부

- 사다리 미끄러짐 -

- 원 인 : 사다리를 이용 중 미끄러지면서 손목에 골절 발생
- 재발방지 : 사다리 사용 시 2인1조 작업



교육 내용

건축공사부

- 테이블쏘 절상 -

- 원 인 : 테이블쏘 작업 중 안전커버 미착용으로 손가락 2개 절상
- 재발방지 : 안전커버 장착 후 전동공구 사용



교육 내용

건축공사부

- 사다리 낙하-

- 원 인 : 낮은 사다리 최상단 발판사중 떨어져 무릎 골절
- 재발방지 : 사다리 사용시 2인 1조 작업
고령작업자 현장 작업 배제



- 전동공구 사용 중 발생 -

- 사고내용 : 가구공사 중 좁은 폭의 몰딩을 길이방향으로 자르던 중 발생
- 사고부위 : 엄지, 검지 손가락 열상 (부분봉합수술진행)
- 예방대책 : 전동공구 사용 시 작업자 주의하며 작업진행 필요



- 전동공구 사용 중 발생 -

- 사고내용 : 기초공사 중 목재 자르던 중 발생
- 사고부위 : 엄지 손가락 열상 (봉합수술진행)
- 예방대책 : 전동공구 사용 시 작업자 주의하며 작업진행 필요



- 이동식 비계 추락 -

- 사고내용 : 도배공사 중 작업완료 후 이동식 비계에서 내려오다 미끄러져 추락
- 사고부위 : 머리 뒷부분 찰과상 및 앞부분 뇌출혈발생
- 예방대책 : 작업 이동 시 주의하며 이동



안전교육

- 높은 말비계 사용 -

- 목 적 : **경량사다리 사용금지**와 동시에 높은 말비계 사용 시 낮은 말비계 사용해 올라갈 수 있도록 해 안전사고 방지



- 현장 응급상황 대처순서 -

1. 작업 중지 및 현장 안전 확보 : 재해자 주변 추가사고 위험 제거
2. 재해자(환자) 상태 확인 : 의식, 호흡, 출혈 여부 확인
3. 상태에따라 119 신고 후 가능한 범위에서 지혈 등 응급처치 실시
(의식있고, 출혈없고, 급한상황이 아니면 소장 동행하여 병원이동)
4. 119 구급대 인계 후 현장소장 동해하여 병원 이동
5. 사고 현장 보존 및 회사 유선보고진행
(유선보고 : 감리담당자 -> 공사부장 -> 부사장 (통화않될시 상급자에게전화)
6. 관련내용 발생 경위서 전자결재 상신

- 차량 사고 메뉴얼-

1. 사고 부위 및 주변나올 수 있게 사진 여러장 촬영
2. 블랙박스 확보
3. 워플 전자결재에 사진과 블랙박스 영상 첨부하여 경위서 작성
4. 차량 사고 비용관련
사고자 본인 부담금 과 추후 할증되는 보험료 중 50% 사고자가 지급

- 명절 전 준비사항 -

- 명절 기간동안 공사 중단
- 23일 현장 마무리
 1. 외부인 출입 제한 / 도어락 비밀번호 변경
 2. 자재 보양
 3. 주변 청소 및 정리 정돈
- 작업 완료 후 사진으로 보고 진행
