

2026 공사부 슬로건

계획은 스마트하게!

업무는 AI처럼!

안전은 완벽하게!

전 파 사 항

- 현장소장 주간 업무 -

- 목 적 : 회사소속 소장 기본 업무

- 밴드 업무 -

1. T.B.M 진행 시 신규채용자, 특별업무교육, 위험성평가 진행 후 업로드
2. 작업 전 금일 작업보고 -> 작업완료 후 작업내용보고 (신규게시물로작성)
3. 매주 금요일 차주 주간일정 업로드

- 워플 업무 -

1. 매주 금요일 주간일정 작성
2. 특근, 대체근무 3일전 전자결재 상신
3. 공사일보 매주 토요일 전자결재 상신
4. 매주 수요일 기성 업로드

해당 업무는 기본적으로 해야될 업무이며 상습적으로 올리지 않으면 문책

건축공사부

- 현장소장 근태 현황 -

- 목 적 : 현장소장님들 현장에 맞게 근무 확인에 목적
- 방 법 : 어플사용해 근태 확인, 특이사항 있을 시 유시열대리에게 내용 전달

2026년 4월 현장소장 근태현황

늦은출근 1회 늦은퇴근 17회 특근 2일

일	월	화	수	목	금	토
			1 ▲07:48 ▼18:03	2 ▲07:57 ▼18:11	3 ▲08:23 ▼18:43	4
5	6 ▲07:43 ▼19:24	7 ▲07:50 ▼18:25	8 ▲08:17 ▼18:55	9 ▲07:30 ▼19:54	10 ▲07:39 ▼19:01	11 특근 ▲08:12 ▼18:29
12	13 ▲07:48 ▼18:22	14 ▲07:41 ▼18:02	15 ▲07:47 ▼19:06	16 ▲07:56 ▼07:43	17 ▲07:43 ▼17:18	18 특근 ▲07:51 ▼16:57
19	20 ▲07:32 ▼18:56	21 ▲07:12 ▼18:26	22 ▲07:19 ▼18:42	23 ▲17:57 ▼17:57	24 ▲08:01 ▼17:20	25
26	27 ▲07:24 ▼19:24	28 ▲07:25 ▼19:14	29 ▲07:28 ▼19:52	30 ▲07:28 ▼17:40		

- 현장소장 연차 작성 방법 -

- 목 적 : 무분별한 특근자제 하여 현장소장 휴식 보장
- 방 법 : 특근, 대휴, 대근 시 3일이전에 워플 전자결재 상신
(긴급사항은 구두보고 후 작성)

- 연차 신청시

더존하우징 계시판 이메일 일정관리 업무관리 **전자결재** 웹디스크 메모장 명함관리 더존PRM

전자결재

신규기안

AS 품의보고서

일일과업보고서 - 인테리어부

일일과업보고서 - 설계부

일일과업보고서 - 설계부2

일일과업보고서 - 분양

일일과업보고서 - KB팀

일일과업보고서 - 공사부

일일과업보고서 - 감리

일일과업보고서 - 기획부

일일과업보고서 - 영업부

공사일보

근태처리원

기안-보고서

연차신청서

연차신청서 부속

(비용)품의서

지출결의서[단일항목]

기안-보고서 - 경남 거창군 거창읍 장팔리 812, 6월 2주차 주간업무보고서 (51)

본 - 2026년 6월 2주차 공사일보(수원 이목동 758-13현장)

본 - 2026년 6월 2주차 공사일보(화성 용두리 301-1현장) (51)

본 - 공사일보_양평 향소리 6월2주차 (51)

본 - 거제연구리현장(공사일보보고서) (51) (21)

본 - 경기도 광주시 남한산성면 불당리 238-3 (51)

본 - 김포시 장기동 1670번지 (6월13까지)공사일보 (51)

본 - 인천마암리179-4 임태진님 6월2주차 업무보고 (51)

본 - 공사일보6월8일~13일 _이재운소장(평창 장전리 111-5) (51)

본 - 공사일보6월8일~13일 _이재운소장(여주 금사 천북리52) (51)

본 - 사고경위서(화성 서신 용두리 301-1현장) (51)

고서 - 경기 화성시 새솔동 69-18 박노범님 (26년 6월 2주차)_더존종합건설 (51)

본 - 2026_0613_세종 금남면 도남리 205-36_공사일보 (51)

본 - 강화 고천리 419-8번지 공사일보 6월2주차 (51)

본 - 경기도 의왕시 학의동 100 (51)

본 - 경기 가평군 상면 행현리729-9 6월1째주 주간보고 (51)

- 현장소장 연차 작성 방법 -

[연차신청서]

문서번호
승인일자
시행일자 2026-06-14
보존기간 5년
기안부서 공사부 감리팀
기안작성 김동완 차장
기안일자

담당									대표
김동완	결재자선택	결재자선택	결재자선택	결재자선택	결재자선택	결재자선택	결재자선택	결재자선택	결재자선택
	감리담당자	감리팀장	공사부장						부사장

배 포 : 제경부전체, 대표이사
회 란 : 공무, 감리, 자재, 김미영과장

제목	현장명 + 000소장 연차신청합니다.
----	----------------------

구분	기간	비고
연차 or 반차	yyyy-mm-dd	yyyy-mm-dd

인수인계	
------	--

현장 진행 현황, 연차 사용 시 현장 관리자 인수인계
단, 현장에 관리자 없이는 현장 진행 불가

* 업무인수인계서를 반드시 협조사에 작성해 주시기 바랍니다.

- 현장소장 특근,대체근무작성 방법 -

- 목 적 : 무분별한 특근자제 하여 현장소장 휴식 보장
- 방 법 : 특근, 대체근무 작성 시 3일이전에 워플 전자결재 상신
(긴급사항은 구두보고 후 작성)

- 연차 신청시

The screenshot displays the '더존하우징' (Daejeon Housing) internal system. At the top, there is a navigation bar with tabs: '계시판', '이메일', '일정관리', '업무관리', '전자결재' (highlighted with a red box and number 1), '웹디스크', '메모장', '명함관리', and '더존PRM'. Below this, a sidebar on the left shows a list of menu items under '전자결재'. The '신규기안' (New Proposal) option is selected, and a dropdown menu is visible. In this menu, '근태처리원' (Attendance Processor) is highlighted with a red box and number 2. The main area of the screen shows a list of proposals with columns for '제목' (Subject), '대기' (Waiting), '진행' (In Progress), '승인' (Approved), '보류' (On Hold), '반려' (Rejected), '기각' (Dismissed), '합의' (Agreed), '시행' (Implemented), '배표' (Assigned), '회람' (Circulated), '상신' (Submitted), and '작성중' (In Progress). The first proposal listed is '☆ 기안-보고서 - 경남 거창군 거창읍 장팔리 812, 6월 2주차 주간업무보고서'.

- 현장소장 대체근무/대체휴무작성 방법 -

[연차신청서]

문서번호
승인일자
시행일자 2026-06-14
보존기간 5년
기안부서 공사부 감리팀
기안작성 김동완 차장
기안일자

담당									대표
김동완	결재자선택	결재자선택	결재자선택	결재자선택	결재자선택	결재자선택	결재자선택	결재자선택	결재자선택
	감리담당자	감리팀장	공사부장						부사장

배포 : 제경부전체, 대표이사
회람 : 공무, 감리, 자재, 김미영과장

제목	현장명 + 000소장 대체근무 신청합니다.
----	-------------------------

구분	기간	비고
대체휴무or 대체근무	dd yyyy-mm-dd	

인수인계	
당일 작업내용 기입, 투입인원 기입	

* 업무인수인계서를 반드시 업소사에 질청해 주시기 바랍니다.

- 공사일보 작성 방법 -

- 목 적 : 공사일보 작성을 통한 현장관리 목적 및 기록
- 방 법 : 한주간 이슈 / 특이사항 / 건축주 협의내용 등
- 공사일보

The screenshot shows the '더존하우징' (Dejeon Housing) web portal. The top navigation bar includes '계서판', '이메일', '일정관리', '업무관리', '전자결재' (highlighted with a red box), '웹디스크', '메모장', '명함관리', and '더존PRM'. Below the navigation bar, there is a section for '전자결재' (Electronic Approval) with a sub-menu '신규기안' (New Proposal). A dropdown menu is open, showing various document types, with '공사일보' (Construction Daily Report) highlighted by a red box and a red number '2'. The main content area displays a list of construction reports, each with a title, date, and location. The first report is '기안-보고서 - 경남 거창군 거창읍 장팔리 812, 6월 2주차 주간업무보고서'.

대기101	진행455	승인	보류22	반려19	기각	합의70	시행3	배포3909	회람4992	상신29	작성중17
★ 제목											
☆ 기안-보고서 - 경남 거창군 거창읍 장팔리 812, 6월 2주차 주간업무보고서 (1)											
AS 품의보고서											
일일과업보고서 - 인테리어부											
일일과업보고서 - 설계부											
일일과업보고서 - 설계부2											
일일과업보고서 - 분양											
일일과업보고서 - KB팀											
일일과업보고서 - 공사부											
일일과업보고서 - 감리											
일일과업보고서 - 기획부											
일일과업보고서 - 영업부											
공사일보											
근태처리원											
기안-보고서											
연차신청서											
연차신청서 복수											
(비용)품의서											
지출결의서[단일항목]											
다중항목지출결의서											
본 - 2026년 6월 2주차 공사일보(수원 이목동 758-13현장)											
본 - 2026년 6월 2주차 공사일보(화성 용두리 301-1현장) (1)											
본 - 공사일보_양평 향소리 6월2주차 (1)											
본 - 거제연구리현장(공사일보보고서) (1) (1)											
본 - 경기도 광주시 남한산성면 불당리 238-3 (1)											
본 - 김포시 장기동 1670번지 (6월13까지)공사일보 (1)											
본 - 인천마암리179-4 임태진님 6월2주차 업무보고 (1)											
본 - 공사일보6월8일~13일_이재운소장(평창 장전리 111-5) (1)											
본 - 공사일보6월8일~13일_이재운소장(여주 금사 전북리52) (1)											
본 - 사고경위서(화성 서신 용두리 301-1현장) (1)											
고서 - 경기 화성시 세솔동 69-18 박노범님 (26년 6월 2주차)_더존종합건설 (1)											
본 - 2026_0613_세종 금남면 도남리 205-36_공사일보 (1)											
본 - 강화 고천리 419-8번지 공사일보 6월2주차 (1)											
본 - 경기도 의왕시 학의동 100 (1)											
본 - 경기 가평군 상면 행현리729-9 6월1째주 주간보고 (1)											

- 공사일보 작성 방법 -

[연차신청서]

문서번호
승인일자
시행일자 2026-06-14
보존기간 5년
기안부서 공사부 감리팀
기안작성 김동완 차장
기안일자

회람 : 공무, 감리, 자재, 김미영과장

* 기본 양식에서 결재자 맞게 변경 필요 *

담당									대표
김동완	결재자선택	결재자선택	결재자선택	결재자선택	결재자선택	결재자선택	결재자선택	결재자선택	결재자선택
	감리담당자	감리팀장	공사부장					부사장	대표이사

제 목	현장명 + 해당주차 ex) 경기 성남시 수정구 창곡동 592-2 정호영님_26년06월2주차 공사일보		
형태	☐ 품의 ☐ 보고	시행일자	yyyy-mm-dd
내용	1. 금주 진행 공종 2. 차주 진행 공종 3. 특이사항 4. 현재 a/s진행 상황		
의견 및 지시사항			

건축공사부

- 설비 비닐 시공 -

- 목 적 : 방통 단열재 전 비닐 시공 부위 확인
- 방 법 : 1층 비닐 시공, 2층 방수슈트 시공 시 (비닐 X)
2층 방수슈트 미시공 시 비닐 시공



1층 바닥



2층 바닥

건축공사부

- 연질, 경질 폼 시공 -

- 목 적 : 외기에 접하는 모든 부분 폼 시공을 통해 단열 확보
- 방 법 : 외벽, 지붕, 폼전체 시공 (무벤트기준)
폼시공 현장은 1층포치, 돌출 침실 경우 폼으로 시공



벽체, 지붕 전체 폼시공



포치 천장

건축공사부

- 스윙창호 후레싱 시공 -

- 목 적 : 미국식(스윙창호)시공 시 4면 후레싱 시공
- 방 법 : 4면 후레싱 시공 후 후레싱과 창호만나는 부분은 외장팀에서 실리콘 코킹
후레싱 뒷면은 레인스크린, 스페이서를 통해 공기층 확보필요

창호공사_1	
2중 유리<30만원/평> <중부1 적용불가>	3중 유리<35만원/평>
<창호설계 기준 초과시 추가>	
삼익 Swing Windows<미국식시스템>	
사양: 미국식<제작 사이즈>	
1중<2중급> 열관류값: 1.32(w/m².K)	3중<1중급> 열관류값: 0.96~1.05(w/m².K)
2중 유리: 24mm<5로이+14알콘+5투명>, 색상: 투명 3중 유리: 35mm<5로이+10알콘+5투명+10알콘+5로이>, 색상: 투명	
조립틀리스<SS, SH, FD>: 118mm, 창틀 내·외부 벽색기본 스윙파티오<PD네탄다형>: 153mm, 창틀 내·외부 벽색기본 창문 : 4면 후레싱시공, 칼라강판<벽물제외>, 창호 색상과 상이함	
단독 주택용 창호 공사 단가 2.5만원/㎡	
옵션: 창틀 내·외부 펠링 / 롤 방충창	

계약 내용



창틀, 후레싱 만나는부위

건축공사부

- 현수막 설치 기준 -


- 목 적 : 현수막 설치 함으로 써 회사 소속감부여 / 광고 효과
- 방 법 : 비계설치 후 바로 현수막 설치 외부에서 가장 잘 보이는 위치
현수막 설치는 선택이 아닌 필수 매뉴얼 입니다.
미설치시 경위서(패널티)



건축공사부

- 강마루 시공 나누기 -


- 목 적 : 과소쪽 발생으로 인한 클레임 방지
- 방 법 : 대형 마루의 경우 적당한 나누기를 통해 과소쪽 발생하지 않도록 해야함
나누기를 업체에서 결정해서 문제 발생 나누기시 현장소장이 결정

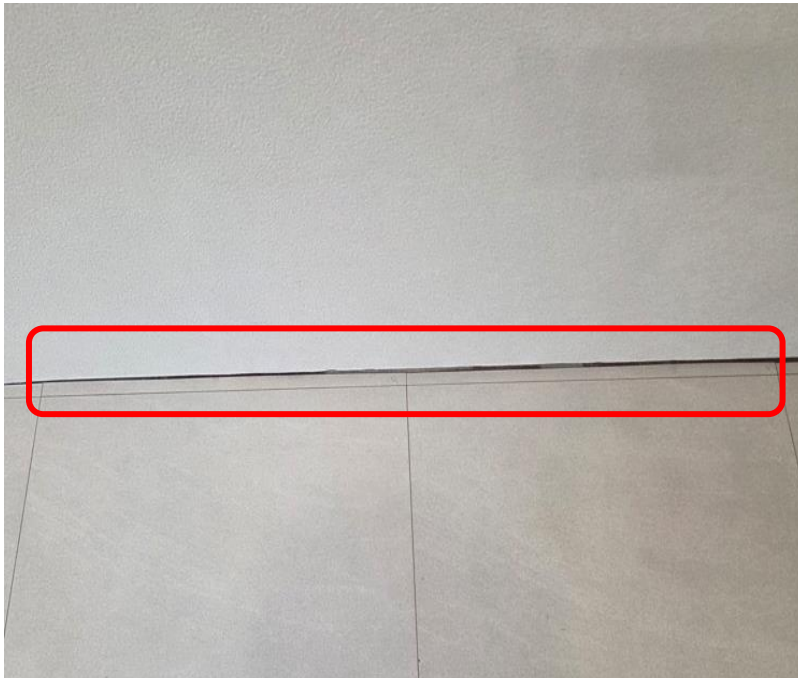

건축공사부

- 구조에 대한 상식 결여-

- 목 적 : 구조체의 완벽한 결합이 되지 않아 공사완료시 마감재 하자발생으로 연결됨
- 방 법 : 전체 재시공, 재시공시발생한 자재 비용은 해당 골조팀 전부 부담.
운반비+자재비 전체, 동시에 패널티 적용

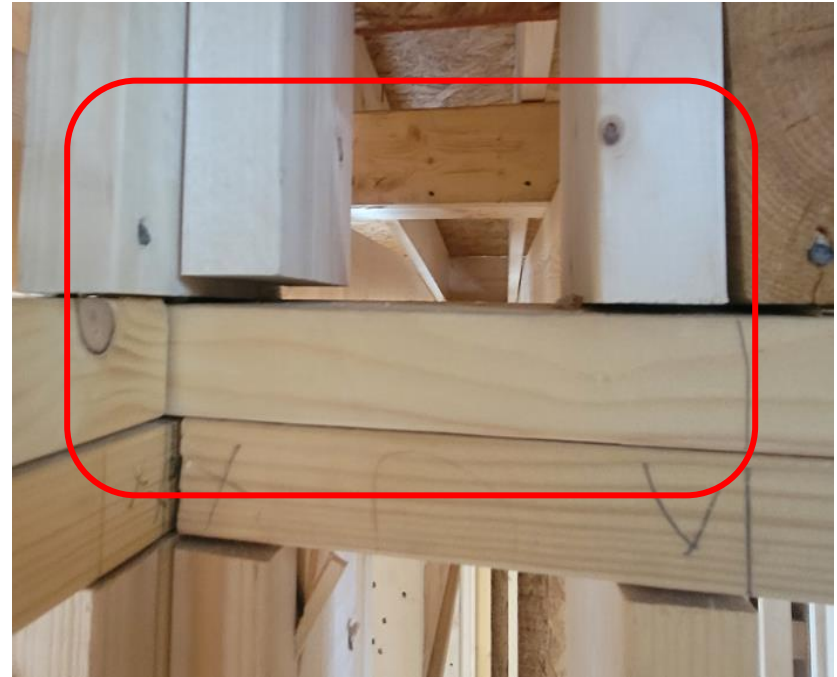

건축공사부


- 실위데크 점검구 -

- 목 적 : 2층 실위데크 점검구를 통해 건축주가 관리
- 방 법 : 현장에서 배수구 위치에 점검구 타공 후 스티커 부착



- 난방배관 병목 구간 소음 -

- 목 적 : 보일러 가동 후 난방배관 소음 발생
- 방 법 : 난방배관 병목 구간 없애고 난방배관사이 간격 30MM이상 확보
(동영상파일 재생필요)

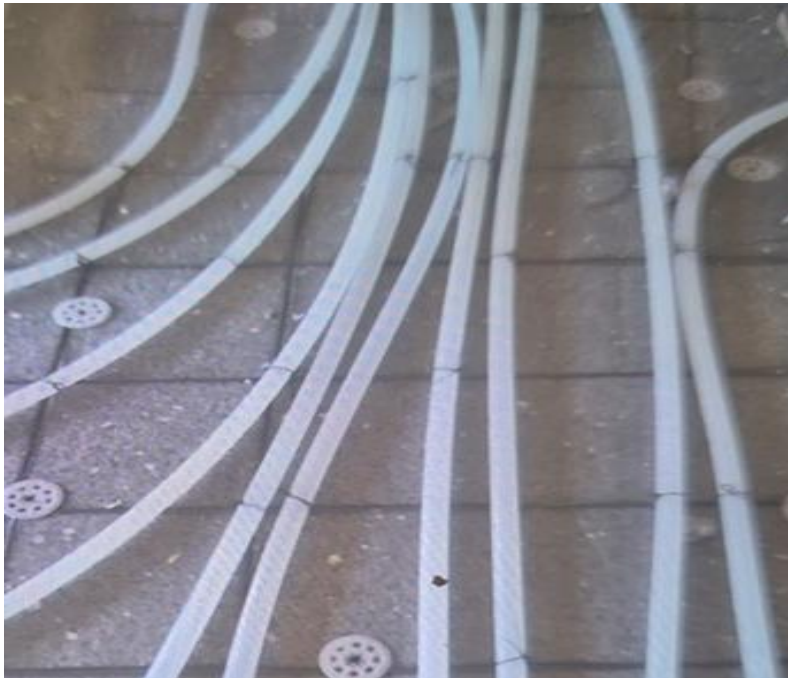

- 현장 토목 업체 소개 기준 -

- 목 적 : 토목업체 소개 후 A/S 발생 시 회사가 자유로울 수 없음
 - 방 법 : 현장소장은 협력업체를 소개 할 때는 천산,환경,동주,라임 소개 시 해당업체에서는 기본 견적서에 **15%추가한 금액이 건축주에게 전달 되어야함**
EX) 업체 기본 견적 2000만원, 건축주 전달 2300만원
이유 : 1. 토목금액 사전 검토를 통한 회사 이미지 관리
(업체과도한 견적 방지)
2. 토목관련 문제 발생 시 회사로 A/S진행 및 책임소재
1. 현장소장 토목 견적금액 검토
 2. 업체 확정 시 감리 담당자 내용 전달
 3. 감리담당자 재경부에 계산서 발행 및 업체 입금 요청 진행 / 확인

- 주 요 공 중 승 인 요청 -

- 목 적 : 재시공이 불가능하거나 치명적 하자가 발생하는 구간을 Hold Point로 지정하고 **감리담당자의 원격 승인 없이는 다음 공정 진행을 원천 차단**
모든 보고는 밴드를 통해 보고 / 밴드에서 승인절차를 지켜 진행
- 요 청 방 법 : **기초 타설 전** : 경계점 이격거리확인, 철근배근간격, 레미콘강도, 오.하수 배관 설치사진(구배확인) / **승인요청**
방통 타설 전: 각 실별 난방배관 설치사진, 냉.온수 파이프 설치사진 / **승인요청**
단열재 공사 후 : 각 실별 단열재 밀실 충전 , 기밀 테이핑 15초 영상 / **승인요청**
외장재 시공 중: 레인스크린(벤트확보), 우수유입 차단 코킹 및 후레싱사진 / **승인요청**
- 승 인 기 준 : 1. **감리자 직접 현장점검 후 승인**
2. **감리자 입회 불가시 밴드로 승인**

1명이 읽었습니다.



후속공정 승인요청

1. 단열재 빈틈없이 밀실 총진확인 : 양호
2. 타이백 교차부위 테이핑 밀착 : 양호
3. 방수테스트(담수완료) : 양호

첨부사진 : 각실별 단열재 시공사진 첨부 15장.
담수사진 첨부 2장
타이백 테이핑 5장
끝.

#승인대기 → 해시태그로 승인요청시,

감리담당: "확인했습니다,,양호합니다.등등 후속공정

😊 표정짓기

💬 댓글쓰기

- 2개 현장 관리 매뉴얼 -

건축공사부

- **현장소장이 없는 현장에서의 TBM 필수진행보고의무 > 해당공종 팀장진행기준**
- **오전/오후 교차 점검 의무화**
현장소장은 2개 현장을 오전과 오후로 반드시 나누어 교차 방문해야 합니다.
한 현장에 상주하여 다른 현장의 관리 공백이 발생하지 않도록 동선을 최적화하여 관리 되어야 합니다.
- **사진 증빙 및 미방문 현장 통제**
물리적으로 방문하지 못한 현장은 작업자로부터 작업 사진을 실시간으로 수령해야 합니다.
사진 증빙이 없는 공정은 미진행으로 간주합니다.
- **주요 공종 필수 입회**
신규 공종 투입 시 사전 작업 지시 와 안전교육 필수!!
공종 마무리 시 최종 품질 확인은 현장소장이 반드시 현장에서 직접 입회하여 승인 해야 함
- **인센티브 및 패널티 규정**
매뉴얼 미준수, 임의 공정 진행, 필수 증빙 누락 시 인센티브 대상에서 제외되며,
중요하자(누수, 시공오류등)가 발생시 패널티조항의 의거하여, 불이익 발새할 수 있고, 이후
현장은 본사의 집중 감리대상으로 분류 됩니다.

건축공사부

- 두개의 현장 공사 진행시 -

시간대	구분	주요 업무 내용
07:30 ~ 08:30	아침 T.B.M	당일 투입 현장(A) 직접 진행 / 미방문 현장(B) 해당공중팀장 TBM시행
08:30 ~ 10:30	오전 현장점검(A)	주요 공중 시공 상태 확인 및 구조/설계 도면 준수 여부 정밀 점검
10:30 ~ 12:00	행정 및 자재 관리	공정표 업데이트, 익일 자재 발주 확인, 협력업체 정산 및 공정 협의
13:00 ~ 16:00	오후 교차점검(B)	현장 이동 후 오후 투입 현장점검, 공중별 체크리스트 참조
16:00 ~ 17:00	마무리/본사보고	현장 정리확인, 익일 작업 지시, 밴드 업무 보고

안전교육

- 현장준비 안전용품 (상시 보유)-

1. 안전모 : 10개 (개당 10,000원)
2. 안전화 : 3개 (260mm, 270mm, 280mm) (개당 45,000원)
3. 안전벨트 : 5개 (개당 50,000원)
4. 보호경 : 5개 (개당 15,000원)

- 현장 개설 시 지급 (관계자미팅시)

- 지급확인서 작성, 자재부 지급 업체, 내용 전달

금일 1층 창고에서 개인별 안전용품 지급 예정
공사부 지시에 따라 각자 수령하여 관리
지급확인서 및 사진자료 없이 지급시 페널티

건축공사부

- 비계설치 시 사전 계획 고려 -

- 문 제 : 1. 비계설치 업체와 협의가 거의 없는 현장들이 많음
2. 문제발생 시 업체 전가하는 소장들 많음
- 방 법 : 비계설치 안전로프등 사전 계획을 통해 설치 필요



건축공사부

- 전동공구 사용 기준 -

- 목 적 : 전동공구 사용 및 안전커버 설치로 안전사고 예방
- 방 법 : 아침 T.B.M시 전동공구 관련 사진 밴드 업로드
전동공구(슬라이딩 커팅기, 테이블쏘, 그라인더 등)
업로드 된 공구만 사용 가능

현재 작업 중인 업체 모두 유선으로 내용 전달 교육 진행
현장에서 안전에 위배된 공구 사용 시 강력한 조치 예정임 (소장, 업체 양벌)



- 테이블 쏘 사용방법 -



- 신입 및 고령 근로자 안전 가이드라인 및 관리 기준안 -

5. 공종별 고령 근로자 적합/금지 업무 분류표

특히 고령자가 집중된 조적/파벽공사 및 기타 마감 공종을 중심으로 실제 업무를 분리하여 지시.

공종	고령자 절대 금지 업무	고령자 허용 및 권장 업무
조적 및 파벽공사 (현장 12 명)	* 2m 이상 비계 상부에서 벽돌 쌓기 작업 * 20kg 이상 시멘트 포대 상시 양중/운반 작업	* 지상부(안전한 평지) 벽돌 쌓기 작업 * 손수레 등을 이용한 소량 분할 운반 * 벽돌 나누기 및 간단한 메지(줄눈) 작업
내장공사 (현장 3 명)	* 천장 석고보드/텍스 상부 지향 작업 * 고소 작업대(렌탈, 말비계) 사용 작업	* 지상부 먹매김 및 자재 치수 측정 지원 * 내장 목재 가공 및 자재 정리정돈
외장공사 (현장 2 명)	* 외벽 외부 안전 미확보 상태 달비계 탑승 작업 * 25kg 이상 고중량 패널 혼자 반복 인양	* 지상 안전구역 마감 자재 하역 및 세팅 작업 * 창틀 주위 등 안전 난간대 확보 내부 코킹작업

건축공사부

- 신입 및 고령 근로자 안전 가이드라인 및 관리 기준안 -

타일공사 (현장 1 명)	* 높은 벽체 타일 시공 (사다리, 우마 작업) * 대형 타일(무거운 자재) 단독 인양 및 부착	* 바닥 타일 시공 지원 (안전한 발판 위) * 타일 메지 작업 및 자재 준비
철근 콘크리트 (현장 1 명)	* 고소 고정용 유로폼 동바리 하부 해체 작업 * 고중량 알폼 프레임 수동 인양 이동	* 지상 거푸집 자재 수거 및 핀 분류 작업 * 부속 정리 보조 및 살수 작업 지원
기타 공종 (공통)	* 밀폐 공간 작업 (질식 우려) * 여름철 폭염 시 12:00~17:00 옥외 작업	* 현장 내 통로 정리정돈 및 신호수 업무 * 단순 기본업무 등

- 신입 및 고령 근로자 안전 가이드라인 및 관리 기준안 -

나. 휴게시간 의무 보장

- 매 50 분 작업 후 10 분 휴식을 기본으로 하되, 기온이 30 도 이상일 시 고령 근로자는 **45 분 작업, 15 분 휴식** 의무화.
- 안전교육장 또는 그늘막설치 준수.

다. 중량물 취급 가이드라인 준수

- 인력으로 들 수 있는 최대 무게를 고령 근로자는 **20kg** 이하로 제한 (일반인 25kg 대지 적용).
- 대차(구루마) 및 양중 장비 사용 적극 지원 및 조적용 경량 리프트(원치) 의무 배치.

라. 동료 감시제

- 고령자와 청년층 근로자를 2 인 1 조로 매칭하여 고령자의 이색 행동이나 건강 이상을 즉각 감지할 수 있도록 편성.

안전사고

- 최근 현장 안전사고 -

건축공사부

1. 현장 구조물 인지 부족으로 인한 사고

- 원인 : 이동 중 비계 구조물 인지 지연으로 코뼈 부상
- 사고자 : **경력 3년 미만 근로자**

2. 사다리 사용 작업 중 미끄러짐 사고

- 원인 : 1인 사다리 사용 작업 중 미끄러지면서 손목 골절
- 사고자 : **61세 고령 근로자**

3. 테이블쏘 절상 사고

- 원인 : 테이블쏘 작업 중 손가락 2개 절상
- 사고자 : **경력 2년 미만 근로자**

4. 사다리 사용 작업 중 낙하

- 원인 : 낮은 사다리 최상단에서 작업 중 낙하하여 무릎 골절
- 사고자 : **71세 고령 근로자**

교육 내용

건축공사부

- 사다리 미끄러짐 -

- 원 인 : 사다리이용 중 미끄러지면서 손목에 골절 발생
- 재발방지 : 사다리 사용 시 2인1조 작업



교육 내용

건축공사부

- 테이블쏘 절상 -

- 원 인 : 테이블쏘 작업 중 안전커버 미착용으로 손가락 2개 절상
- 재발방지 : 안전커버 장착 후 전동공구 사용



교육 내용

건축공사부

- 사다리 낙하-

- 원 인 : 낮은 사다리 최상단 발판사중 떨어져 무릎 골절
- 재발방지 : 사다리 사용시 2인 1조 작업
고령작업자 현장 작업 배제

